



Data
18/09/2023 11:02:51

Setor de Origem
REIT - PROT-REIT

Tipo

Gestão de Contrato: Solicitação
de Medição de Execução
Contratual

Assunto

Solicitação da 9ª Medição dos serviços - Vitus Engenharia - Campus Viana - Obra
de Construção de Quadra Poliesportiva - CT Nº 21-2022 e Sub-rogação Nº 03-
2022

Interessados

VIRTUS ENGENHARIA LTDA-EPP

Situação

Finalizado

Trâmites

- 27/10/2023 13:28
Recebido por: DAP-VNA: Hawllyson Rocha Costa
- 25/10/2023 15:11
Enviado por: CEOF-VNA: Lucilene Rodrigues de Melo
- 19/10/2023 11:38
Recebido por: CEOF-VNA: Lucilene Rodrigues de Melo
- 17/10/2023 10:34
Enviado por: CPGP-VNA: Wanderson do Nascimento Pereira
- 17/10/2023 09:53
Recebido por: CPGP-VNA: Wanderson do Nascimento Pereira
- 17/10/2023 09:18
Enviado por: CLCC-VNA: Adriano Freire Everton
- 17/10/2023 09:16
Recebido por: CLCC-VNA: Adriano Freire Everton
- 16/10/2023 17:33
Enviado por: CEOF-VNA: Jeane Santos Gomes Serra
- 06/10/2023 15:03
Recebido por: CEOF-VNA: Jeane Santos Gomes Serra
- 06/10/2023 10:02
Enviado por: CONT-VNA: Lucilene Rodrigues de Melo
- 06/10/2023 09:35
Recebido por: CONT-VNA: Lucilene Rodrigues de Melo
- 05/10/2023 15:24
Enviado por: CLCC-VNA: Adriano Freire Everton
- 05/10/2023 15:02
Recebido por: CLCC-VNA: Adriano Freire Everton



05/10/2023 14:53

Enviado por: CPGP-VNA: Wanderson do Nascimento Pereira

05/10/2023 14:15

Recebido por: CPGP-VNA: Wanderson do Nascimento Pereira

04/10/2023 10:07

Enviado por: DAP-VNA: Wanderson do Nascimento Pereira

04/10/2023 10:06

Recebido por: DAP-VNA: Wanderson do Nascimento Pereira

28/09/2023 11:51

Enviado por: COENG-PROAD: Ramom Luiz Pavao Ribeiro

22/09/2023 09:54

Recebido por: COENG-PROAD: Kleyton Lisboa da Cruz

21/09/2023 16:37

Enviado por: DINFRA-PROAD: Walterney Rodrigues Pereira

21/09/2023 16:36

Recebido por: DINFRA-PROAD: Walterney Rodrigues Pereira

18/09/2023 11:15

Enviado por: PROT-REIT: Leandro Pereira Alves

AO**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFMA
DINFRA – Departamento de Infraestrutura**

Prezados Senhores,

Pelo presente, subtendemos a vossa apreciação solicitação de pagamento referente à 9ª medição dos serviços da obra de Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1, para o Instituto Federal do Maranhão - IFMA - Campus Viana, conforme contrato de nº 021/2022 e Sub-rogação de nº 03/2022.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

São Luís (MA), 18 de setembro de 2023.

Álvaro Vicente Batista Novais

Sócio Administrador

Eng. Civil – CREA/CONFEA 111363913-0



Documento Digitalizado Público

OFÍCIO 02.1809.23- Solicitação da 9ª Medição dos serviços - Vitus Engenharia - Campus Viana - Obra de Construção de Quadra Poliesportiva - CT Nº 21-2022 e Sub-rogação Nº 03-2022

Assunto: OFÍCIO 02.1809.23- Solicitação da 9ª Medição dos serviços - Vitus Engenharia - Campus Viana - Obra de Construção de Quadra Poliesportiva - CT Nº 21-2022 e Sub-rogação Nº 03-2022

Assinado por: Leandro Alves

Tipo do Documento: Ofício

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **TERCEIRIZADO - PROTOCOLO**, em 18/09/2023 11:03:38.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/09/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 625999

Código de Autenticação: 5213b9e3e3





Despacho:

À Coordenadoria de Obras e Serviços de Engenharia, para junto da fiscalização técnica realizar os levantamentos de campo (SCDP e/ou Frota.), necessários para a efetivação da 9ª(NONA) Medição, referente à obra CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL DO IFMA CAMPUS VIANA Contrato nº21/2022, sub-rogação nº03-2022 Após a medição realizada, proceder ao preenchimento do formulário eletrônico de ateste/recebimento da parcela/medição pelos fiscais técnico e administrativo.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Walterney Rodrigues Pereira, Walterney Rodrigues Pereira - CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DINFRA-PROAD, DINFRA-PROAD, em 21/09/2023 16:37:14.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

TERMO DE ATESTE DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO

1. DADOS DO CONTRATO (consultar o Comprasnet Contratos 4.0 ou SUAP)

- ORGÃO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS VIANA
- UASG / UG: 154856
- TIPO DA LICITAÇÃO: RDC Eletrônico
- Nº DA LICITAÇÃO: 02/2022
- Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 23249.003015.2022-36
- Nº DO CONTRATO: 21/2022
- OBJETO CONTRATADO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE TIPO 01 PARA IFMA CAMPUS VIANA
- INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/09/2022
- TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: **27/10/2023**
- VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.427.544,18

2. DADOS DA NOTA FISCAL OU FATURA (verificar se é eletrônica e possui chave válida)

- Nº DA NOTA FISCAL OU FATURA :00000148
- MÊS / ANO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/23
- RAZÃO SOCIAL DO CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS VIANA
- CNPJ / CPF DO CONTRATANTE: 10.735.145/0024-80
- RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO: VIRTUS ENGENHARIA LTDA.
- CNPJ / CPF DO CONTRATADO: 31.229.242/0001-85
- DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023
- DATA DE RECEBIMENTO: 27/09/2023
- DATA DE VENCIMENTO: 27/10/2023
- PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: AGOSTO A SETEMBRO DE 2023
- LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: IFMA VIANA
- VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 32.900,46
- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (Descrever os Itens do Contrato): Foram executados serviços de superestrutura (pilares, vigas e lajes), serviços de emboço, chapisco e reboco de laje, canaletas de drenagem, pavimentação externa, arquivancada, e administração local.
- OBSERVAÇÕES:

3. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – FISCALIZAÇÃO

- NOME DO RESPONSÁVEL: Raimundo Nonato Pinheiro Corrêa Filho
- MATRÍCULA SIAPE: 1641623
- CARGO E/OU FUNÇÃO: Arquiteto e Urbanista
- LOTAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: Reitoria
- TIPO DE FISCALIZAÇÃO: (X) TÉCNICA () ADMINISTRATIVA () SETORIAL
- REGISTRO E ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS NO PERÍODO DA MEDIÇÃO

Sem ocorrências, serviços realizados conforme normas técnicas vigentes.

- VALOR APROVADO: R\$ 32.900,46
- PARECER CONCLUSIVO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO: Apto para Pagamento.

Por meio deste instrumento, nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Instrução Normativa N° 05 de 26 de maio de 2017, a fiscalização atesta o recebimento provisório dos serviços executados, após a verificação da sua conformidade em relação às especificações do Projeto Básico/Termo de Referência e cláusulas do contrato. O recebimento provisório não exclui ou diminui as responsabilidades civis da contratada pela solidez e segurança dos serviços prestados, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos em lei ou contrato.

ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA FISCALIZAÇÃO

(assinado eletronicamente)
Ramom Luiz Pavão Ribeiro
Responsável pela Fiscalização

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ramom Luiz Pavao Ribeiro, ARQUITETO E URBANISTA**, em 28/09/2023 11:27:26.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/09/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 715570

Código de Autenticação: 3c23905b5f



Documento Digitalizado Público

Nota Fiscal de serviços executados pela Virtus Engenharia para a 9ª Medição da Obra da Quadra FNDE

Assunto: Nota Fiscal de serviços executados pela Virtus Engenharia para a 9ª Medição da Obra da Quadra FNDE
Assinado por: Ramom Luiz
Tipo do Documento: Nota Fiscal / Fatura
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **ARQUITETO E URBANISTA**, em 28/09/2023 11:39:50.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/09/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 635599
Código de Autenticação: 53bdda56a3





CERTIFICADO

1020230092166323



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008211352023

Validade: 30/12/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 31.229.242/0001-85	Inscrição Municipal: 98238663
Razão Social: VIRTUS ENGENHARIA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
711200000 – SERVICOS DE ENGENHARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA Coronel Colares Moreira	
Número: 3	Complemento: EDIF BUSINES CENTER ;EDIF SALA 906;
Bairro: Jardim RenascenÃsa	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075441

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **01 de setembro de 2023 às 11:52**, sob o código de autenticidade nº **837AF32EE8F1A4A11082527241EF4EA1**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 054024/23

Data da Certidão: 27/07/2023 13:51:22

CPF/CNPJ CONSULTADO: 31229242000185

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/11/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/08/2023 14:15:09



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 217048/23

Data da Certidão: 16/08/2023 09:27:56

CPF/CNPJ 31229242000185 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/09/2023 10:59:26



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIRTUS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.229.242/0001-85

Certidão nº: 50725652/2023

Expedição: 22/09/2023, às 10:04:17

Validade: 20/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIRTUS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.229.242/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 31.229.242/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:32:02 do dia 19/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/10/2023.

Código de controle da certidão: **847F.8083.9890.BEA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.229.242/0001-85
Razão Social: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 25 CD SUBCOND 07 PATIO / VINHAIS / SÃO LUIS / MA / 65074-199

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2023 a 03/10/2023

Certificação Número: 2023090406520138614613

Informação obtida em 22/09/2023 10:02:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Documento Digitalizado Público

Certidões Unificadas da Empresa Virtus para a 9ª Medição da Obra da Quadra FNDE Campus Viana

Assunto: Certidões Unificadas da Empresa Virtus para a 9ª Medição da Obra da Quadra FNDE Campus Viana
Assinado por: Ramom Luiz
Tipo do Documento: Certidão
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **ARQUITETO E URBANISTA**, em 28/09/2023 11:40:49.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/09/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 635602
Código de Autenticação: 0bdb540c30



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			330				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		330	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11			
DATA ATUAL:		21/08/2023		segunda-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONCLUÍDO A ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS
- 7- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO



CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				331	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		331	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS		
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			11		
DATA ATUAL:		22/08/2023		terça-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO


Augusto Vicente Batista Neri
Engenheiro Civil
CRM 100.000.000-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				332		
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		332	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS		
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11		
DATA ATUAL:		23/08/2023		quarta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS						
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO


 A. S. Vieira Batista Nery
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 1134191/0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			333				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		333	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11			
DATA ATUAL:		24/08/2023		quinta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO



CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			334				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		334	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11			
DATA ATUAL:		25/08/2023		sexta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO

 Alexandre Balista Naveis Engenheiro Civil CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO	
--	--	--------------	--

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				335			
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		335	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA				PESSOAL EFETIVO TOTAL				0			
DATA ATUAL:		26/08/2023		sábado		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM	
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

SEM ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


Alexandre Bastos Neri
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO


EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			336				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		336	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA				PESSOAL EFETIVO TOTAL				0			
DATA ATUAL:		27/08/2023		domingo		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


Ayres Vicente Batista Nivali
Engenheiro Civil
CREA-33529/2017-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				337	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		337
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		28/08/2023		segunda-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO


 Alexandre Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 13318/2017-9

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				338
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	338
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			11	
DATA ATUAL:		29/08/2023		terça-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO	
---	--	---------------------	--

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			339				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		339	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11			
DATA ATUAL:		30/08/2023		quarta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO

 Álvaro Vicente Batista Naves Engenheiro Civil CREA 113381813-0 CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO	
---	--	---------------------	--



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				341
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	341
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			11	
DATA ATUAL:		01/09/2023		sexta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- | |
|---|
| 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS |
| 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL |
| 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ |
| 4- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA |
| 5- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS |

OBSERVAÇÃO:

- | |
|---|
| 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA |
| 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL |
| 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ |
| 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA |
| 5- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO |

FISCALIZAÇÃO


Álvaro Vicente Balista Nuñez
Engenheiro Civ.
CRA-144443-2

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				342			
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		342	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA				PESSOAL EFETIVO TOTAL				0			
DATA ATUAL:		02/09/2023		sábado		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

SEM ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


 Alexandre Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 000000000000000000

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				343
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	343
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS
ENDEREÇO: IFMA - VIANA				PESSOAL EFETIVO TOTAL				0
DATA ATUAL:		03/09/2023		domingo		TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS		
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA

RELATÓRIO CONSTRUTORA

DSR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


 Alexandre Brito Bezelli
 Engenheiro Civil
 CREA 113839/0-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				344	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		344
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		04/09/2023		segunda-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO



CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			345				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		345	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11			
DATA ATUAL:		05/09/2023		terça-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONCLUÍDA AA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 5- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO



CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				346	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		346
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		06/09/2023		quarta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO	
---	--	---------------------	--

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			347
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	347
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO		180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL		11	
DATA ATUAL:		07/09/2023		quinta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS			
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO


 André Vicente Batista Naveili
 Engenheiro Civil
 CREM 11130/1913-9

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				348			
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		348	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA				PESSOAL EFETIVO TOTAL				0			
DATA ATUAL:		08/09/2023		sexta-feira				TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

SEM ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRA - DIA COMPENSADO PELO FERIADO NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


Augusto Vicente Batista Nivalis
Engenheiro Civil
CRM 111111/MA

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				349			
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		349	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA				PESSOAL EFETIVO TOTAL				0			
DATA ATUAL:		09/09/2023		sábado		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

SEM ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:
FISCALIZAÇÃO

 Augusto Vicente Batista Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA 112.000/2013
CONSTRUTORA
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				350
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	350
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS
ENDEREÇO: IFMA - VIANA				PESSOAL EFETIVO TOTAL				0
DATA ATUAL:		10/09/2023		domingo		TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS		
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA

RELATÓRIO CONSTRUTORA

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


Augusto Vicente Batista Nogueira
Engenheiro Civil
CREA 111287/2012-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				351	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		351
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				10	
DATA ATUAL:		11/09/2023		segunda-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	3	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO


 Augusto Vicente Batista Neres
 Engenheiro Civil
 CREA 000000000-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				352
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	352
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				10
DATA ATUAL:		12/09/2023		terça-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	3	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO


 André Vicente Batista Nóbrega
 Engenheiro Civil
 CREA 11239/2013-D

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			353	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	353
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			10	
DATA ATUAL:		13/09/2023		quarta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	3	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO


 Alexandre Vicente Batista
 Engenheiro Civil
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			354	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	354	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			10	
DATA ATUAL:		14/09/2023		quinta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	3	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO

 Alexandre Vicente Batista Bezelli Engenheiro Civil CREA 13338/2013-0		FISCALIZAÇÃO	
CONSTRUTORA			

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				356
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	356
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			0	
DATA ATUAL:		16/09/2023		sábado			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

SEM ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


 Álvaro Vicente Batista Neves
 Engenheiro Civil
 CREM 151263/2013-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO


EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				357	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	357	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS		
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			0		
DATA ATUAL:		17/09/2023		domingo			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


 Augusto Vicente Batista Neres
 Engenheiro Civil
 CREA 11136/2013-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			358				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		358	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				10			
DATA ATUAL:		18/09/2023		segunda-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL							EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO	3	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 4- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA
- 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS E CONCRETAGEM DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ E VIGAS EM ARCO
- 4- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO

FISCALIZAÇÃO


 Alexandre Vicente Batista Nivali
 Engenheiro Civil
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA						RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			359
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INÍCIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		359
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA						PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS
ENDEREÇO: IFMA - VIANA						PESSOAL EFETIVO TOTAL			10
DATA ATUAL:		19/09/2023		terça-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS			
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	3	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		BRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- | |
|---|
| 1- CHAPISCO E REBOCO NAS ALVENARIAS E NA LAJE DE COBERTURA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS |
| 2- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL |
| 3- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ |
| 4- EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS |

OBSERVAÇÃO:

- | |
|--|
| 1- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS E LAJE DE COBERTURA |
| 1- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL |
| 3- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS E CONCRETAGEM DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ E VIGAS EM ARCO |
| 4- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS DEGRÁUS DA ARQUIBANCADAS, INCLUINDO ALVENARIAS, ENCHIMENTO DE CAIXAS E LAJE DE PISO |

FISCALIZAÇÃO

Alvaro Vicente Batista Naves
Engenheiro Civil
CREA 011101110
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DE ANDAMENTO E FOTOGRÁFICO DE OBRA

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA	RELATÓRIO DE ANDAMENTO	RAF.08
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	08/VNA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	INÍCIO DE OBRA	26/09/2022
ENDEREÇO: IFMA - VIANA	PRAZO DE OBRA	180 DIAS
PERÍODO:	A	20/08/2023
	DIAS CORRIDOS	329



Conclusão dos Pilares de seção Variável



Conclusão da Laje de Cobertura, incluindo as o Complementos das Vigas Invertidas e Laje Suporte do Reservatório



Execução de Calçadas Externas e Canaletas de Drenagem Pluvial



Execução de Calçadas Externas e Canaletas de Drenagem Pluvial



Execução de Calçadas Externas e Canaletas de Drenagem Pluvial



Execução de Degraús de Arquibancada



Chapisco, Reboco em Alvenarias e Laje de Cobertura; Fiação Elétrica



Chapisco, Reboco em Alvenarias e Laje de Cobertura; Fiação Elétrica

OBSERVAÇÕES: No período de 21/08a 20/09/23 foi concluído a execução dos Pilares de seção variável; foi iniciada a execução de calçadas e canaletas de drenagem pluvial, incluindo escavações de valas, nivelmento e compactação de solo, alvenarias e laje de piso; foi dada continuidade na execução chapisco e reboco das alvenarias executadas e da laje de cobertura; foi iniciada a armação de formas e ferragens de pilares e vigas superiores de das paredes em combogo; foi concluída a laje de cobertura da ala dos banheiros e vestiários, incluindo a laje de suporte do reservatório elevado; foi concluída a concretagem das vigas invertidas de suporte da laje de cobertura; foi iniciada a execução dos degraus da arquibancada

Assinatura
 A. V. VICENTE BAIXO N. VALLI
 Engenheiro Civil
 CREA 15239/2013-D

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

Documento Digitalizado Público

Relatório Diário de Obras referente ao período de serviços executados para a 9ª Medição da Obra da Quadra FNDE - Campus Viana

Assunto: Relatório Diário de Obras referente ao período de serviços executados para a 9ª Medição da Obra da Quadra FNDE - Campus Viana
Assinado por: Ramom Luiz
Tipo do Documento: Relatório
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

▪ **ARQUITETO E URBANISTA**, em 28/09/2023 11:42:22.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/09/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 635605

Código de Autenticação: caf0d41726





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

PERÍODO DE REFERÊNCIA

19/08/23 a 22/09/23

Nº DA MEDIÇÃO

9

PRAZO (MÊS)

11

DATA DA VISTORIA 20/09/2023

		PLANILHA RESUMO	VALORES				% Exec.	% Exec.
			Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Acum.
PLANILHA	A	QUADRA POLIESPORTIVA	1.427.544,18	32.900,46	394.459,61	1.019.112,69	2,30%	27,63%
		CUSTO TOTAL DO ÍTEM	1.427.544,18	R\$ 32.900,46	R\$ 394.459,61	R\$ 1.019.112,69	2,30%	27,63%

		MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO (COM BDI)	R\$ 1.427.544,18	R\$ 32.900,46	R\$ 394.459,61	R\$ 1.019.112,69

	PORCENTAGEM	VALOR	% Executado Acumulado	27,63%
TOTAL MÃO DE OBRA	42,94%	R\$ 14.126,32	% Executado no Período	2,30%
TOTAL MATERIAL	57,06%	R\$ 18.774,13		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/08/23 a 22/09/23
N.º DA MEDIÇÃO: 9
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 20/09/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES			VALORES					% Exec.	
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	6,40	M2	R\$ 41,52	R\$ 200,79	R\$ 242,31	R\$ 1.550,78		6,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.550,78	R\$ -	100,00%
	1.2	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	170,02	M	R\$ 21,51	R\$ 37,01	R\$ 58,52	R\$ 9.949,22			170,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.949,22	
	1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	1,00	UN	R\$ 1.288,48	R\$ 4.209,93	R\$ 5.498,41	R\$ 5.498,41			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.498,41	
	1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		UN	R\$ -	R\$ 3.467,51	R\$ 3.467,51	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (PESSOAL)	6,00	MÊS	R\$ 12.957,87	R\$ 520,46	R\$ 13.478,33	R\$ 80.869,96	0,16	1,60	4,40	R\$ 2.089,14	R\$ 2.008,47	R\$ 80,67	R\$ 21.581,50	R\$ 59.288,47	26,69%
	1.6	TRANSPORTE DE PERFURATRIZ ROTATIVA ATÉ 250 (MÍNIMO 100KM)	215,00	KM	R\$ -	R\$ 16,62	R\$ 16,62	R\$ 3.574,00			215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.574,00	
	1.7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	R\$ 277,57	R\$ 827,30	R\$ 1.104,87	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	1.8	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	60,00	M2	R\$ 46,68	R\$ 129,56	R\$ 176,24	R\$ 10.574,36		60,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.574,36	R\$ -	100,00%
	1.9	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	45,00	M	R\$ -	R\$ 41,20	R\$ 41,20	R\$ 1.854,14		45,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.854,14	R\$ -	100,00%
	1.10	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	1.774,24	M2	R\$ 1,52	R\$ 0,26	R\$ 1,77	R\$ 3.149,17		1774,24		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.149,17	R\$ -	100,00%
CUSTO TOTAL DO ÍTEM								117.020,04				R\$ 2.089,14	R\$ 2.008,47	R\$ 80,67	R\$ 38.709,95	R\$ 78.310,09	33,08%
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES															
	2.1	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)		M2	R\$ 27,19	R\$ 5,45	R\$ 32,63	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	2.2	MURETA - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA		M3	R\$ 15,43	R\$ 3,00	R\$ 18,43	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	2.3	ARQUIBANCADAS - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE		M3	R\$ 133,93	R\$ 25,95	R\$ 159,88	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3	R\$ 1,11	R\$ 5,08	R\$ 6,19	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM																
SERVIÇOS EM TERRA - TERRAPLENAGEM	3	SERVIÇOS EM TERRA - TERRAPLENAGEM															
	3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU DE JAZIDA	2664,00	M3	R\$ 0,20	R\$ 0,52	R\$ 0,72	R\$ 1.907,68		500,00	2.164,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 358,05	R\$ 1.549,63	18,77%
	3.2	ATERRO (ARGILA OU BARRO) RETIRADO EM JAZIDA, SEM TRANSPORTE	2664,00	M3	R\$ 6,83	R\$ 24,17	R\$ 31,00	R\$ 82.584,67		650,00	2.014,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.150,16	R\$ 62.434,50	24,40%
	3.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020		M3	R\$ 1,14	R\$ 6,26	R\$ 7,40	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	3.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	888,00	M3	R\$ 0,17	R\$ 1,78	R\$ 1,95	R\$ 1.728,33		524,00	364,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.019,87	R\$ 708,46	59,01%
	3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	13320,00	M3XKM	R\$ 0,12	R\$ 1,37	R\$ 1,49	R\$ 19.810,54		13000,00	320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.334,61	R\$ 475,93	97,60%
	3.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	2664,00	M3	R\$ 2,25	R\$ 4,99	R\$ 7,24	R\$ 19.288,78		849,00	1.815,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.147,21	R\$ 13.141,57	31,87%
	3.7	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	5,00	dia	R\$ 285,03	R\$ 21,05	R\$ 306,08	R\$ 1.530,40		5,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.530,40	R\$ -	100,00%
	3.8	ENSAIO - COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL COM REUSO DE MATERIAL (6 PONTOS)	2,00	UN	R\$ -	R\$ 152,67	R\$ 152,67	R\$ 305,34			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,34	
	3.9	Trinta e Dois Mil Novecentos Reais e Quarenta e Seis Centavos	2,00	UN	R\$ -	R\$ 105,81	R\$ 105,81	R\$ 211,62			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,62	
CUSTO TOTAL DO ÍTEM								127.367,35							R\$ 48.540,30	R\$ 78.827,05	38,11%
LOCAÇÃO	4	LOCAÇÃO															
	4.1	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	785,00	M2	R\$ 1,82	R\$ 2,90	R\$ 4,72	R\$ 3.704,33		785,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.704,33	R\$ -	100,00%
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							3.704,33							R\$ 3.704,33		100,00%
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAMENTAÇÕES	5	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAMENTAÇÕES															
	5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	455,38	M3	R\$ 15,59	R\$ 34,10	R\$ 49,69	R\$ 22.628,84			455,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.628,84	
	5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	81,67	M3	R\$ 35,27	R\$ 7,06	R\$ 42,33	R\$ 3.457,03		81,67		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.457,03	R\$ -	100,00%
	5.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	106,71	M2	R\$ 0,51	R\$ 1,02	R\$ 1,53	R\$ 163,28		106,71		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,28	R\$ -	100,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/08/23 a 22/09/23
N.º DA MEDIÇÃO: 9
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 20/09/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES			VALORES					% Exec.		
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
MOVIMENTO TERREIRO E FUNDAÇÕES	5.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	36,89	M3	R\$ 21,38	R\$ 4,29	R\$ 25,66	R\$ 946,71		36,89		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 946,71	R\$ -	100,00%	
	5.5	ATERRO DE ÁREAS COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO.	22,50	M3	R\$ 24,89	R\$ 66,16	R\$ 91,05	R\$ 2.048,59		22,50		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.048,59	R\$ -	100,00%	
	CUSTO TOTAL DO ITEM							29.244,44							R\$ 6.615,60	R\$ 22.628,84	22,62%	
FUNDAÇÕES	6	FUNDAÇÕES																
	6.1	CONCRETO ARMADO - BLOCOS																
	6.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. AF_01/2020	91,00	M	R\$ 8,44	R\$ 71,06	R\$ 79,50	R\$ 7.234,41			91,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.234,41		
	6.1.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. AF_01/2020	112,00	M	R\$ 7,60	R\$ 145,51	R\$ 153,12	R\$ 17.149,01			112,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.149,01		
	6.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	67,20	M2	R\$ 6,96	R\$ 10,32	R\$ 17,28	R\$ 1.161,50		67,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.161,50	R\$ -	100,00%	
	6.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	120,03	M2	R\$ 52,81	R\$ 48,13	R\$ 100,94	R\$ 12.115,71		120,03		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.115,71	R\$ -	100,00%	
	6.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	76,40	KG	R\$ 2,83	R\$ 8,54	R\$ 11,37	R\$ 868,81		76,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,81	R\$ -	100,00%	
	6.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	142,50	KG	R\$ 2,00	R\$ 8,68	R\$ 10,69	R\$ 1.522,81		142,50		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,81	R\$ -	100,00%	
	6.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	95,80	KG	R\$ 1,44	R\$ 8,12	R\$ 9,56	R\$ 915,86		95,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 915,86	R\$ -	100,00%	
	6.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	286,50	KG	R\$ 1,05	R\$ 7,04	R\$ 8,09	R\$ 2.318,15		286,50		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.318,15	R\$ -	100,00%	
	6.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	273,40	KG	R\$ 3,98	R\$ 8,08	R\$ 12,06	R\$ 3.296,48		273,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.296,48	R\$ -	100,00%	
	6.1.10	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	33,51	M3	R\$ 99,66	R\$ 279,25	R\$ 378,91	R\$ 12.697,37		33,51		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.697,37	R\$ -	100,00%	
	6.1.11	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	50,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 528,81			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,81		
	6.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	6.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	2,58	M2	R\$ 6,96	R\$ 10,32	R\$ 17,28	R\$ 44,59		2,58		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,59	R\$ -	100,00%	
	6.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	139,57	M2	R\$ 52,81	R\$ 48,13	R\$ 100,94	R\$ 14.088,06		139,57		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.088,06	R\$ -	100,00%	
	6.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	389,64	KG	R\$ 1,05	R\$ 7,04	R\$ 8,09	R\$ 3.152,69		389,64		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.152,69	R\$ -	100,00%	
	6.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	137,73	KG	R\$ 3,98	R\$ 8,08	R\$ 12,06	R\$ 1.660,66		137,73		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.660,66	R\$ -	100,00%	
	6.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	10,05	M3	R\$ 99,66	R\$ 279,25	R\$ 378,91	R\$ 3.808,07		10,05		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.808,07	R\$ -	100,00%	
	6.2.6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	50,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 528,81			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,81		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							83.091,78								R\$ 57.650,75	R\$ 25.441,03	69,38%
	SUPERESTRUTURA	7	SUPERESTRUTURA															
		7.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS															
		7.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	126,72	M2	R\$ 44,77	R\$ 76,48	R\$ 121,25	R\$ 15.364,39		108,00	18,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.094,65	R\$ 2.269,74	85,23%
7.1.2		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	428,55	KG	R\$ 0,55	R\$ 6,97	R\$ 7,52	R\$ 3.220,96		365,00	63,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.743,32	R\$ 477,64	85,17%	
7.1.3		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	127,36	KG	R\$ 2,70	R\$ 7,76	R\$ 10,46	R\$ 1.332,17		109,00	18,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.140,13	R\$ 192,04	85,58%	
7.1.4		CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	8,52	M3	R\$ 156,89	R\$ 418,04	R\$ 574,93	R\$ 4.898,38		7,25	1,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.168,22	R\$ 730,16	85,09%	
7.1.5		CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	30,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 317,29			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,29		
7.2		CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/08/23 a 22/09/23
N.º DA MEDIÇÃO: 9
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 20/09/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
SUPERESTRUTURA	7.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	155,73	M2	R\$ 24,18	R\$ 26,06	R\$ 50,24	R\$ 7.824,35	12,73	145,73	10,00	R\$ 639,59	R\$ 307,83	R\$ 331,76	R\$ 7.321,92	R\$ 502,43	93,58%	
	7.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1946,45	KG	R\$ 0,55	R\$ 6,97	R\$ 7,52	R\$ 14.629,43		1946,45		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.629,43	R\$ -	100,00%	
	7.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	240,18	KG	R\$ 2,70	R\$ 7,76	R\$ 10,46	R\$ 2.512,26		240,18		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.512,26	R\$ -	100,00%	
	7.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	10,71	M3	R\$ 114,98	R\$ 359,80	R\$ 474,78	R\$ 5.084,93	0,76	9,91	0,80	R\$ 360,84	R\$ 87,39	R\$ 273,45	R\$ 4.705,11	R\$ 379,83	92,53%	
	7.2.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	84,33	M2	R\$ 20,76	R\$ 125,85	R\$ 146,61	R\$ 12.363,62		84,33		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.363,62	R\$ -	100,00%	
	7.2.6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	50,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 528,81			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,81		
	7.3	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	7.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	111,80	M2	R\$ 11,53	R\$ 23,94	R\$ 35,47	R\$ 3.966,02	111,80	111,80		R\$ 3.966,02	R\$ 1.289,30	R\$ 2.676,72	R\$ 3.966,02	R\$ -	100,00%	
	7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	135,39	KG	R\$ 0,55	R\$ 6,97	R\$ 7,52	R\$ 1.017,58	135,39	135,39		R\$ 1.017,58	R\$ 74,05	R\$ 943,53	R\$ 1.017,58	R\$ -	100,00%	
	7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	95,93	KG	R\$ 2,70	R\$ 7,76	R\$ 10,46	R\$ 1.003,42	95,93	95,93		R\$ 1.003,42	R\$ 259,39	R\$ 744,03	R\$ 1.003,42	R\$ -	100,00%	
	7.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	6,59	M3	R\$ 114,98	R\$ 359,80	R\$ 474,78	R\$ 3.128,83	6,59	6,59		R\$ 3.128,83	R\$ 757,74	R\$ 2.371,09	R\$ 3.128,83	R\$ -	100,00%	
	7.3.5	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	30,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 317,29			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,29		
	7.4	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	7.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	10,80	M2	R\$ 9,51	R\$ 17,72	R\$ 27,24	R\$ 294,15			10,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294,15		
	7.4.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	33,83	M3	R\$ 24,38	R\$ 57,27	R\$ 81,65	R\$ 2.762,13	5,60	5,60	28,23	R\$ 457,22	R\$ 136,54	R\$ 320,69	R\$ 457,22	R\$ 2.304,90	16,55%	
	7.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	1001,47	M2	R\$ 8,35	R\$ 14,77	R\$ 23,12	R\$ 23.151,05	62,28	62,28	939,19	R\$ 1.439,73	R\$ 520,08	R\$ 919,65	R\$ 1.439,73	R\$ 21.711,32	6,22%	
	7.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	27,07	M3	R\$ 156,89	R\$ 418,04	R\$ 574,93	R\$ 15.563,29	4,98	4,98	22,09	R\$ 2.863,14	R\$ 781,32	R\$ 2.081,82	R\$ 2.863,14	R\$ 12.700,15	18,40%	
	7.4.5	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	50,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 528,81			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,81		
	7.5	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	7.5.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	33,90	M	R\$ 10,23	R\$ 38,27	R\$ 48,50	R\$ 1.644,31		33,90		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.644,31	R\$ -	100,00%	
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							121.453,45				R\$ 14.876,37	R\$ 4.213,64	R\$ 10.662,73	R\$ 78.198,91	R\$ 43.254,55	64,39%	
	8	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL																
	8.1	ELEMENTO VAZADO																
	8.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE	134,72	M2	R\$ 45,15	R\$ 83,43	R\$ 128,59	R\$ 17.323,00			134,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.323,00		
	8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	8.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19	259,22	M2	R\$ 29,74	R\$ 23,81	R\$ 53,55	R\$ 13.882,33		259,22		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.882,33	R\$ -	100,00%	
	8.2.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO.	69,40	M	R\$ 8,47	R\$ 7,86	R\$ 16,33	R\$ 1.133,26		69,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.133,26	R\$ -	100,00%	
	8.3	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	8.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	148,08	M2	R\$ 29,74	R\$ 23,81	R\$ 53,55	R\$ 7.930,31	88,76	148,08		R\$ 4.753,47	R\$ 2.640,03	R\$ 2.113,44	R\$ 7.930,31	R\$ -	100,00%	
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							40.268,90				R\$ 4.753,47	R\$ 2.640,03	R\$ 2.113,44	R\$ 22.945,90	R\$ 17.323,00	56,98%	
9	ESQUADRIAS																	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/08/23 a 22/09/23
N.º DA MEDIÇÃO: 9
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 20/09/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
ESQUADRIAS	9.1	PORTAS DE MADEIRA																
	9.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,	2,00	UN	R\$ 177,20	R\$ 446,79	R\$ 623,98	R\$ 1.247,97			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247,97		
	9.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,	1,00	UN	R\$ 184,47	R\$ 492,36	R\$ 676,83	R\$ 676,83			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 676,83		
	9.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4,00	UN	R\$ 35,75	R\$ 419,61	R\$ 455,36	R\$ 1.821,43			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.821,43		
	9.1.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	UN	R\$ 105,92	R\$ 361,09	R\$ 467,01	R\$ 934,02			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 934,02		
	9.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS																
	9.2.1	SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 50CM EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D = 1 1/2"	15,00	UN	R\$ 14,45	R\$ 39,73	R\$ 54,18	R\$ 812,68			15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 812,68		
	9.2.2	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM CHAPA EM AÇO GALVANIZADO Nº24, 200X100CM, COLADA C/ ADESIVO COMPOUND OU SIMILAR, SOBRE COMPENSADO NAVAL	4,30	M2	R\$ 22,72	R\$ 79,01	R\$ 101,73	R\$ 437,43			4,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,43		
	9.2.3	TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	6,00	UN	R\$ 13,26	R\$ 42,60	R\$ 55,86	R\$ 335,17			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,17		
	9.3	JANELAS DE ALUMÍNIO																
	9.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	10,80	M2	R\$ 33,29	R\$ 414,12	R\$ 447,42	R\$ 4.832,13			10,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.832,13		
	9.4	VIDROS																
	9.4.1	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	4,32	M2	R\$ 11,72	R\$ 357,09	R\$ 368,81	R\$ 1.593,25			4,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.593,25		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 12.690,91								R\$ 12.690,91		
SISTEMAS DE COBERTURA	10	SISTEMAS DE COBERTURA																
	10.1	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, PRÉ-PINTADA,	1030,40	M2	R\$ 10,18	R\$ 69,82	R\$ 80,00	R\$ 82.432,87			1.030,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.432,87		
	10.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS,	11.334,40	KG	R\$ 1,63	R\$ 13,51	R\$ 15,14	R\$ 171.626,35		570,00	10.764,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.630,98	R\$ 162.995,37	5,03%	
	CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 254.059,22							R\$ 8.630,98	R\$ 245.428,24	3,40%	
IMPERMEABILIZ	11	IMPERMEABILIZAÇÃO																
	11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	379,63	M2	R\$ 8,40	R\$ 19,99	R\$ 28,40	R\$ 10.781,13		379,63		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.781,13	R\$ -	100,00%	
	11.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	676,67	M2	R\$ 0,35	R\$ 1,70	R\$ 2,05	R\$ 1.387,42	62,28	62,28	614,39	R\$ 127,70	R\$ 21,59	R\$ 106,11	R\$ 127,70	R\$ 1.259,72	9,20%	
	CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 12.168,54				R\$ 127,70	R\$ 21,59	R\$ 106,11	R\$ 10.908,82	R\$ 1.259,72	89,65%	
	12	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																
	12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	803,09	M2	R\$ 3,31	R\$ 1,52	R\$ 4,83	R\$ 3.878,17		725,00	78,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.501,07	R\$ 377,10	90,28%	
	12.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	84,33	M2	R\$ 0,95	R\$ 3,24	R\$ 4,19	R\$ 353,56			84,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,56		
	12.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	743,93	M2	R\$ 9,26	R\$ 10,52	R\$ 19,78	R\$ 14.715,97		521,30	222,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.312,04	R\$ 4.403,93	70,07%	
	12.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	445,04	M2	R\$ 4,76	R\$ 14,15	R\$ 18,91	R\$ 8.414,00		379,00	66,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.165,44	R\$ 1.248,56	85,16%	
	12.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	84,33	M2	R\$ 11,80	R\$ 6,99	R\$ 18,80	R\$ 1.585,06	84,33	84,33		R\$ 1.585,06	R\$ 995,25	R\$ 589,81	R\$ 1.585,06	R\$ -	100,00%	
	12.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	140,33	M2	R\$ 3,31	R\$ 1,52	R\$ 4,83	R\$ 677,66			140,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,66		
	12.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	140,33	M2	R\$ 9,26	R\$ 10,52	R\$ 19,78	R\$ 2.775,92			140,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.775,92		
	12.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	140,33	M2	R\$ 4,76	R\$ 14,15	R\$ 18,91	R\$ 2.653,10			140,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.653,10		
	12.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	210,50	M2	R\$ 14,66	R\$ 33,13	R\$ 47,79	R\$ 10.060,81			210,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.060,81		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL: VIANA-MA
CONSTRUTORA: VIRTUS ENGENHARIA
DESCRIÇÃO: Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/08/23 a 22/09/23
Nº DA MEDIÇÃO: 9
PRAZO DA OBRA (mês): 11

DATA DA VISTORIA: 20/09/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
SISTEMAS DE PISOS	12.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	85,51	M2	R\$ 13,03	R\$ 47,66	R\$ 60,70	R\$ 5.190,18			85,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.190,18		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							50.304,45				R\$ 1.585,06	R\$ 995,25	R\$ 589,81	R\$ 22.563,61	R\$ 27.740,83	44,85%	
	13	SISTEMAS DE PISOS																
	13.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																
	13.1.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA = 5,0CM, C/ CONCRETO FCK = 21MPA	64,91	M2	R\$ 0,95	R\$ 17,57	R\$ 18,52	R\$ 1.202,17			64,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202,17		
	13.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	64,91	M2	R\$ 7,27	R\$ 14,94	R\$ 22,21	R\$ 1.441,73			64,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.441,73		
	13.1.3	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	676,67	M2	R\$ -	R\$ 33,66	R\$ 33,66	R\$ 22.778,51			676,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.778,51		
	13.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	64,91	M2	R\$ 7,66	R\$ 30,38	R\$ 38,04	R\$ 2.469,09			64,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.469,09		
	13.1.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	2,70	M	R\$ 13,70	R\$ 66,03	R\$ 79,74	R\$ 215,29			2,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,29		
	13.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	13.2.1	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, ESPESSURA 5CM	195,79	M2	R\$ 21,35	R\$ 65,96	R\$ 87,30	R\$ 17.092,97		40,00	155,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.492,10	R\$ 13.600,87	20,43%	
	13.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	1,82	M3	R\$ 45,95	R\$ 193,49	R\$ 239,45	R\$ 435,79			1,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,79		
	13.2.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,	5,85	M2	R\$ 22,14	R\$ 44,05	R\$ 66,19	R\$ 387,19			5,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,19		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							46.022,74							R\$ 3.492,10	R\$ 42.530,64	7,59%	
JULGA	14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																
	14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC																
	14.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	18,00	M	R\$ 2,32	R\$ 2,80	R\$ 5,12	R\$ 92,21			18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,21		
	14.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	72,00	M	R\$ 0,62	R\$ 3,23	R\$ 3,85	R\$ 277,18			72,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,18		
	14.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	28,00	M	R\$ 1,07	R\$ 7,20	R\$ 8,27	R\$ 231,70			28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,70		
	14.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	30,00	M	R\$ 1,43	R\$ 10,50	R\$ 11,93	R\$ 357,86			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,86		
	14.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	36,00	M	R\$ 1,69	R\$ 12,01	R\$ 13,70	R\$ 493,12			36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 493,12		
	14.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	25,00	UN	R\$ 2,02	R\$ 1,53	R\$ 3,54	R\$ 88,59			25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,59		
	14.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	8,00	UN	R\$ 1,75	R\$ 2,87	R\$ 4,62	R\$ 36,97			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,97		
	14.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	6,00	UN	R\$ 2,76	R\$ 6,63	R\$ 9,39	R\$ 56,33			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,33		
	14.1.9	JOELHO 90º RED. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIÂM= 32MMX3/4"	4,00	UN	R\$ 4,48	R\$ 12,29	R\$ 16,77	R\$ 67,08			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,08		
	14.1.10	JOELHO PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO 40MM X 1 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R\$ 5,38	R\$ 13,58	R\$ 18,96	R\$ 37,92			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,92		
	14.1.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	16,00	UN	R\$ 3,71	R\$ 6,09	R\$ 9,80	R\$ 156,78			16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,78		
	14.1.12	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	4,00	UN	R\$ 2,59	R\$ 6,62	R\$ 9,21	R\$ 36,85			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,85		
	14.1.13	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	4,00	UN	R\$ 4,45	R\$ 17,51	R\$ 21,96	R\$ 87,84			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,84		
	14.1.14	TÉ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 40MM	2,00	UN	R\$ 7,93	R\$ 17,79	R\$ 25,72	R\$ 51,45			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,45		
	14.1.15	LUIVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	8,00	UN	R\$ 2,29	R\$ 2,32	R\$ 4,61	R\$ 36,87			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,87		
	14.1.16	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	4,00	UN	R\$ 2,73	R\$ 2,85	R\$ 5,58	R\$ 22,33			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,33		
	14.1.17	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	4,00	UN	R\$ 1,87	R\$ 4,73	R\$ 6,60	R\$ 26,42			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,42		
	14.1.18	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	2,00	UN	R\$ 2,70	R\$ 11,96	R\$ 14,66	R\$ 29,33			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,33		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/08/23 a 22/09/23
N.º DA MEDIÇÃO: 9
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 20/09/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
INSTALAÇÃO HIDRÁ	14.1.19	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 40MM	2,00	UN	R\$ 3,36	R\$ 4,58	R\$ 7,94	R\$ 15,88			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,88		
	14.1.20	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM	4,00	UN	R\$ 5,15	R\$ 5,49	R\$ 10,63	R\$ 42,53			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,53		
	14.1.21	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 2,41	R\$ 6,83	R\$ 9,24	R\$ 55,45			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,45		
	14.1.22	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN	R\$ 3,81	R\$ 26,91	R\$ 30,72	R\$ 61,44			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,44		
	14.2	REGISTROS E OUTROS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	14.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 5,84	R\$ 21,75	R\$ 27,59	R\$ 55,18			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,18		
	14.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 15,05	R\$ 58,94	R\$ 73,99	R\$ 147,98			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,98		
	14.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 14,29	R\$ 102,77	R\$ 117,06	R\$ 234,12			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,12		
	14.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 21,09	R\$ 89,71	R\$ 110,81	R\$ 221,61			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 221,61		
	14.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 15,91	R\$ 64,64	R\$ 80,55	R\$ 161,09			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,09		
	14.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 7,06	R\$ 58,97	R\$ 66,03	R\$ 132,06			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,06		
	14.2.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	8,00	UN	R\$ 12,73	R\$ 49,85	R\$ 62,59	R\$ 500,70			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,70		
	14.2.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	12,00	UN	R\$ 0,94	R\$ 1,48	R\$ 2,42	R\$ 29,08			12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,08		
	14.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 1,22	R\$ 2,49	R\$ 3,71	R\$ 14,84			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,84		
	14.2.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 1,81	R\$ 7,01	R\$ 8,82	R\$ 35,28			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,28		
	14.2.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 1,89	R\$ 5,56	R\$ 7,45	R\$ 29,79			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,79		
	14.2.12	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00	UN	R\$ 2,60	R\$ 3,12	R\$ 5,72	R\$ 57,17			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,17		
	14.2.13	FLANGE PVC RÍGIDO PARA CAIXA D'ÁGUA 25MM (ADAPTADOR C/FLANGE E ANEL)	3,00	UN	R\$ 4,49	R\$ 9,63	R\$ 14,13	R\$ 42,38			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,38		
	14.2.14	FLANGE PVC RÍGIDO PARA CAIXA D'ÁGUA 50MM (ADAPTADOR C/FLANGE E ANEL)	2,00	UN	R\$ 5,40	R\$ 19,75	R\$ 25,15	R\$ 50,30			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,30		
	14.2.15	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	1,00	UN	R\$ 102,94	R\$ 1.087,57	R\$ 1.190,51	R\$ 1.190,51			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,51		
CUSTO TOTAL DO ITEM								5.264,21								R\$ 5.264,21		
15	15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																
	15.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC																
	15.1.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	47,50	M	R\$ 6,94	R\$ 5,20	R\$ 12,14	R\$ 576,79			47,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 576,79		
	15.1.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	21,50	M	R\$ 9,01	R\$ 9,61	R\$ 18,62	R\$ 400,30			21,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,30		
	15.1.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	36,00	M	R\$ 17,34	R\$ 18,35	R\$ 35,69	R\$ 1.285,01			36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.285,01		
	15.1.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,00	UN	R\$ 2,25	R\$ 2,21	R\$ 4,46	R\$ 31,19			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,19		
	15.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 6,36	R\$ 10,38	R\$ 16,75	R\$ 100,47			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,47		
	15.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	10,00	UN	R\$ 2,47	R\$ 4,18	R\$ 6,64	R\$ 66,41			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,41		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/08/23 a 22/09/23
N.º DA MEDIÇÃO: 9
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 20/09/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	15.1.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 4,71	R\$ 10,78	R\$ 15,48	R\$ 92,91			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,91		
	15.1.8	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	5,00	UN	R\$ 11,95	R\$ 21,04	R\$ 32,98	R\$ 164,92			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,92		
	15.1.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,00	UN	R\$ 9,45	R\$ 24,06	R\$ 33,52	R\$ 167,58			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,58		
	15.1.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	UN	R\$ 7,26	R\$ 20,72	R\$ 27,98	R\$ 27,98			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,98		
	15.1.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	16,00	UN	R\$ 2,53	R\$ 4,66	R\$ 7,19	R\$ 114,97			16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,97		
	15.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	15.2.1	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D= 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR	6,00	UN	R\$ 14,35	R\$ 33,07	R\$ 47,42	R\$ 284,53			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,53		
	15.2.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	2,00	UN	R\$ 221,58	R\$ 182,39	R\$ 403,96	R\$ 807,93			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 807,93		
	15.2.3	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 2,26	R\$ 7,36	R\$ 9,63	R\$ 57,77			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,77		
	15.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	8,00	M	R\$ 1,84	R\$ 7,66	R\$ 9,50	R\$ 75,99			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,99		
	15.2.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 3,24	R\$ 11,40	R\$ 14,64	R\$ 117,12			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,12		
	15.2.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 2,09	R\$ 2,54	R\$ 4,63	R\$ 37,02			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,02		
	15.2.7	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	1,00	UN	R\$ 1.018,38	R\$ 1.466,44	R\$ 2.484,82	R\$ 2.484,82		1,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.484,82	R\$ -	100,00%	
	15.2.8	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,40 X 1,20 M	1,00	UN	R\$ 3.487,36	R\$ 4.754,14	R\$ 8.241,49	R\$ 8.241,49		1,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.241,49	R\$ -	100,00%	
	CUSTO TOTAL DO ITEM							15.135,19								R\$ 4.371,86		
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																
	16.1	CANAleta EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM SEÇÃO EXTERNA 50 X 50CM	76,40	M	R\$ 53,62	R\$ 50,93	R\$ 104,56	R\$ 7.988,09	15,50	15,50	60,90	R\$ 1.620,62	R\$ 831,18	R\$ 789,44	R\$ 1.620,62	R\$ 6.367,47	20,29%	
	16.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	1,87	M3	R\$ 21,60	R\$ 56,83	R\$ 78,43	R\$ 146,67			1,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,67		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							8.134,77				R\$ 1.620,62	R\$ 831,18	R\$ 789,44	R\$ 1.620,62	R\$ 6.514,14	19,92%	
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	17	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS																
	17.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 15,04	R\$ 253,51	R\$ 268,55	R\$ 1.611,29			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.611,29		
	17.2	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6,00	UN	R\$ 24,05	R\$ 155,02	R\$ 179,07	R\$ 1.074,40			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.074,40		
	17.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 10,97	R\$ 69,94	R\$ 80,91	R\$ 485,48			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,48		
	17.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 19,84	R\$ 129,70	R\$ 149,54	R\$ 299,08			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,08		
	17.5	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	2,00	UN	R\$ 11,46	R\$ 148,64	R\$ 160,10	R\$ 320,20			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,20		
	17.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 6,31	R\$ 33,47	R\$ 39,78	R\$ 318,22			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,22		
	17.7	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 8,63	R\$ 43,64	R\$ 52,27	R\$ 104,54			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,54		
	17.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 10,78	R\$ 62,62	R\$ 73,40	R\$ 440,38			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,38		
	17.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 6,45	R\$ 44,33	R\$ 50,78	R\$ 304,69			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,69		
	17.10	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R\$ 6,07	R\$ 34,00	R\$ 40,07	R\$ 160,28			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,28		
	17.11	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R\$ 3,22	R\$ 48,83	R\$ 52,05	R\$ 208,19			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,19		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/08/23 a 22/09/23
N.º DA MEDIÇÃO: 9
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 20/09/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	17.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 2,57	R\$ 23,48	R\$ 26,05	R\$ 156,33			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,33		
	17.13	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	2,00	UN	R\$ 36,45	R\$ 669,88	R\$ 706,33	R\$ 1.412,67			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.412,67		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							6.895,75								R\$ 6.895,75		
	18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO																
	18.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020_P	2,00	UN	R\$ 71,43	R\$ 142,62	R\$ 214,05	R\$ 428,09			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 428,09		
	18.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	4,00	UN	R\$ 4,95	R\$ 15,04	R\$ 19,99	R\$ 79,96			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,96		
	18.3	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS C/ TINTA ACRILICA RODOVIÁRIA COR AMARELA, 01 DEMÃO	2,00	M2	R\$ 16,82	R\$ 4,12	R\$ 20,94	R\$ 41,88			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,88		
	18.4	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	4,00	UN	R\$ 3,16	R\$ 13,62	R\$ 16,78	R\$ 67,13			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,13		
	18.5	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	2,00	UN	R\$ 2,67	R\$ 8,94	R\$ 11,62	R\$ 23,23			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,23		
CUSTO TOTAL DO ITEM							640,29									R\$ 640,29		
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V																
	19.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO																
	19.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 18,40	R\$ 348,98	R\$ 367,39	R\$ 367,39			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,39		
	19.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 60,96	R\$ 474,01	R\$ 534,97	R\$ 534,97			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 534,97		
	19.1.3	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	1,00	UN	R\$ 132,88	R\$ 400,48	R\$ 533,36	R\$ 533,36			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,36		
	19.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	7,00	UN	R\$ 1,56	R\$ 5,96	R\$ 7,52	R\$ 52,65			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,65		
	19.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	5,00	UN	R\$ 2,36	R\$ 6,27	R\$ 8,63	R\$ 43,15			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,15		
	19.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	8,00	UN	R\$ 2,36	R\$ 6,27	R\$ 8,63	R\$ 69,04			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,04		
	19.1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 31,70	R\$ 241,17	R\$ 272,87	R\$ 545,74			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,74		
	19.1.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	1,00	UN	R\$ 55,10	R\$ 224,24	R\$ 279,33	R\$ 279,33			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,33		
	19.1.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	4,00	UN	R\$ 12,26	R\$ 50,88	R\$ 63,14	R\$ 252,56			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 252,56		
	19.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS																
	19.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	28,00	M	R\$ 3,81	R\$ 2,12	R\$ 5,92	R\$ 165,89	17,10	17,10	10,90	R\$ 101,31	R\$ 65,08	R\$ 36,24	R\$ 101,31	R\$ 64,58	61,07%	
	19.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00	M	R\$ 4,43	R\$ 3,33	R\$ 7,76	R\$ 139,69	18,00	18,00		R\$ 139,69	R\$ 79,73	R\$ 59,96	R\$ 139,69	R\$ -	100,00%	
	19.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00	M	R\$ 6,25	R\$ 7,12	R\$ 13,37	R\$ 240,61			18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,61		
	19.2.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	82,00	M	R\$ 9,20	R\$ 12,21	R\$ 21,41	R\$ 1.755,58			82,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.755,58		
	19.2.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	13,00	M	R\$ 11,19	R\$ 21,30	R\$ 32,48	R\$ 422,26			13,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 422,26		
	19.2.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	30,00	M	R\$ 12,41	R\$ 22,14	R\$ 34,55	R\$ 1.036,50			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,50		
	19.2.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	5,00	UN	R\$ 11,25	R\$ 9,61	R\$ 20,86	R\$ 104,29			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,29		
	19.2.8	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	5,00	UN	R\$ 7,90	R\$ 9,96	R\$ 17,87	R\$ 89,33			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,33		
	19.2.9	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4"	4,00	UN	R\$ 7,13	R\$ 8,82	R\$ 15,95	R\$ 63,80			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,80		
	19.2.10	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "XA" DE 3/4"	1,00	UN	R\$ 8,33	R\$ 13,92	R\$ 22,25	R\$ 22,25			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,25		
	19.2.11	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	50,00	UN	R\$ 2,22	R\$ 2,37	R\$ 4,58	R\$ 229,21			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,21		
	19.2.12	ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO 1 " 25MM (DAISA BC-100) OU SIMILAR	4,00	UN	R\$ 2,34	R\$ 2,07	R\$ 4,41	R\$ 17,65			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,65		
	19.2.13	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	4,00	UN	R\$ 2,36	R\$ 2,24	R\$ 4,61	R\$ 18,43			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,43		
	19.2.14	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	15,00	UN	R\$ 0,26	R\$ 0,44	R\$ 0,70	R\$ 10,47			15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,47		
	19.2.15	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	2,00	UN	R\$ 0,32	R\$ 1,11	R\$ 1,43	R\$ 2,86			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,86		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL: VIANA-MA
CONSTRUTORA: VIRTUS ENGENHARIA
DESCRIÇÃO: Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/08/23 a 22/09/23
Nº DA MEDIÇÃO: 9
PRAZO DA OBRA (mês): 11

DATA DA VISTORIA: 20/09/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
IN	19.2.16	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	1,00	UN	R\$ 1,08	R\$ 1,67	R\$ 2,75	R\$ 2,75			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,75		
	19.2.17	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	15,00	UN	R\$ 6,68	R\$ 7,26	R\$ 13,94	R\$ 209,14			15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,14		
	19.2.18	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 10,85	R\$ 11,71	R\$ 22,56	R\$ 45,12			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,12		
	19.2.19	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 8,00	R\$ 18,57	R\$ 26,56	R\$ 26,56			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,56		
	19.2.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16,00	UN	R\$ 6,45	R\$ 2,56	R\$ 9,01	R\$ 144,15			16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,15		
	19.2.21	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UN	R\$ 3,91	R\$ 3,48	R\$ 7,39	R\$ 51,71	7,00	7,00		R\$ 51,71	R\$ 27,34	R\$ 24,37	R\$ 51,71	R\$ -	100,00%	
	19.3	CABOS E FIOS CONDUTORES										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	19.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	190,00	M	R\$ 1,02	R\$ 2,02	R\$ 3,04	R\$ 577,96			190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,96		
	19.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	820,00	M	R\$ 1,49	R\$ 3,56	R\$ 5,06	R\$ 4.145,53			820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.145,53		
	19.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	14,00	M	R\$ 4,71	R\$ 12,94	R\$ 17,65	R\$ 247,12			14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,12		
	19.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	41,00	M	R\$ 5,30	R\$ 24,54	R\$ 29,84	R\$ 1.223,33			41,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,33		
	19.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	19.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,00	UN	R\$ 8,77	R\$ 8,08	R\$ 16,85	R\$ 67,40			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,40		
	19.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UN	R\$ 8,43	R\$ 9,86	R\$ 18,29	R\$ 18,29			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,29		
	19.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UN	R\$ 7,97	R\$ 7,97	R\$ 15,94	R\$ 111,56			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,56		
	19.4.4	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT - REV 01	1,00	UN	R\$ 28,46	R\$ 53,47	R\$ 81,93	R\$ 81,93			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,93		
	19.4.5	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	6,00	UN	R\$ 30,24	R\$ 70,14	R\$ 100,38	R\$ 602,29			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 602,29		
	19.4.6	LUMINÁRIA HIGH BAY LED DC 100W, 150° (2 X50W) 5000K, 150 LM/W, EM ALUMÍNIO COM ALÇA, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: HBMLD-DC-150-100-50-3C, DA GLIGHT OU SIMILAR	20,00	UN	R\$ 32,28	R\$ 684,30	R\$ 716,58	R\$ 14.331,60			20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.331,60		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							28.883,46				R\$ 292,72	R\$ 172,15	R\$ 120,57	R\$ 292,72	R\$ 28.590,75	1,01%	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)																
	20.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	7,00	UN	R\$ 79,78	R\$ 189,69	R\$ 269,47	R\$ 1.886,27			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.886,27		
	20.2	CAIXA DE EQUILIBRAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	1,00	UN	R\$ 27,76	R\$ 202,25	R\$ 230,01	R\$ 230,01			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,01		
	20.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	39,20	M	R\$ 13,58	R\$ 31,13	R\$ 44,72	R\$ 1.752,88			39,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.752,88		
	20.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	126,32	M	R\$ 16,50	R\$ 42,14	R\$ 58,64	R\$ 7.407,44			126,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.407,44		
	20.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	21,00	M	R\$ 3,61	R\$ 7,92	R\$ 11,54	R\$ 242,28			21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,28		
	20.6	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV. REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UN	R\$ 2,63	R\$ 3,38	R\$ 6,01	R\$ 42,07			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,07		
	20.7	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PARA-RAIO)	7,00	UN	R\$ 6,05	R\$ 24,79	R\$ 30,84	R\$ 215,89			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,89		
	20.8	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUIROS PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UN	R\$ 2,38	R\$ 14,19	R\$ 16,57	R\$ 116,02			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,02		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							11.892,85								R\$ 11.892,85		
VIMENTOS	21	PINTURAS E ACABAMENTOS																
	21.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	529,37	M2	R\$ 5,38	R\$ 5,64	R\$ 11,02	R\$ 5.835,24			529,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.835,24		
	21.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	445,04	M2	R\$ 3,09	R\$ 6,30	R\$ 9,39	R\$ 4.178,40			445,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.178,40		
	21.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	84,33	M2	R\$ 4,00	R\$ 6,47	R\$ 10,47	R\$ 882,60			84,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 882,60		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA




EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/08/23 a 22/09/23
N.º DA MEDIÇÃO: 9
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 20/09/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES			VALORES					% Exec.		
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
PINTURAS E ACABA	21.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_ 05/2021	483,80	M2	R\$ 6,48	R\$ 33,95	R\$ 40,43	R\$ 19.558,00			483,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.558,00		
	21.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	275,60	M	R\$ 3,91	R\$ 1,22	R\$ 5,13	R\$ 1.413,54			275,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.413,54		
	21.6	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	366,82	M2	R\$ 7,01	R\$ 7,39	R\$ 14,40	R\$ 5.280,51			366,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.280,51		
	21.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020_P	567,82	M2	R\$ 13,97	R\$ 13,97	R\$ 27,94	R\$ 15.864,89			567,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.864,89		
	21.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020_P	1.030,40	M2	R\$ 13,97	R\$ 13,97	R\$ 27,94	R\$ 28.789,38			1.030,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.789,38		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							81.802,56								R\$ 81.802,56		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
	22.1	GERAL																
	22.1.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	2,50	M2	R\$ 35,70	R\$ 257,83	R\$ 293,53	R\$ 733,83			2,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 733,83		
	22.1.2	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	1,00	CJ	R\$ 10,82	R\$ 5.230,83	R\$ 5.241,64	R\$ 5.241,64			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.241,64		
	22.1.3	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	1,00	par	R\$ -	R\$ 3.894,00	R\$ 3.894,00	R\$ 3.894,00			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.894,00		
	22.1.4	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	1,00	CJ	R\$ -	R\$ 894,47	R\$ 894,47	R\$ 894,47			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 894,47		
	22.1.5	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO - REV 02	9,60	M	R\$ 29,50	R\$ 182,18	R\$ 211,69	R\$ 2.032,21			9,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.032,21		
	6.1	CONCRETO ARMADO - BLOCOS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	22.2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_ 03/2021	201,00	M2	R\$ 21,92	R\$ 99,80	R\$ 121,71	R\$ 24.464,10			201,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.464,10		
	22.2.2	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO - REV 01_01/2022	7,56	M2	R\$ 75,41	R\$ 385,10	R\$ 460,51	R\$ 3.481,46			7,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.481,46		
CUSTO TOTAL DO ITEM							40.741,71								R\$ 40.741,71			
SERVIÇOS FINAIS	23	SERVIÇOS FINAIS																
	23.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_ 04/2019	296,01	M2	R\$ 0,35	R\$ 0,08	R\$ 0,42	R\$ 125,00			296,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,00		
	23.2	LIMPEZA DE VIDROS	21,90	M2	R\$ 5,34	R\$ 1,08	R\$ 6,41	R\$ 140,47			21,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,47		
	23.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_ 04/2019	64,91	M2	R\$ 0,86	R\$ 0,17	R\$ 1,03	R\$ 67,14			64,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,14		
	23.4	LIMPEZA GERAL	785,00	M2	R\$ 0,95	R\$ 0,61	R\$ 1,55	R\$ 1.220,36			785,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.220,36		
	23.5	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M	1,00	UN	R\$ 13,01	R\$ 1.365,27	R\$ 1.378,28	R\$ 1.378,28			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.378,28		
CUSTO TOTAL DO ITEM							2.931,25								R\$ 2.931,25			
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO (SEM BDI)																		
BDI																		
CUSTO DA CONSTRUÇÃO COM BDI																		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO



1 DADOS DO CONTRATO

1.1 NÚMERO DO CONTRATO VALOR DO CONTRATO :

1.2 NÚMERO DO PROCESSO

1.3 OBJETO:

1.4 CONTRATANTE:

1.5 CONTRATADA:

2 FISCALIZAÇÃO

2.1 RESP. TÉCNICO DA OBRA

2.2 FISCAL TITULAR DO CONTRATO

2.3 FISCAL SUBST. DO CONTRATO


3 RESUMO FINANCEIRO

3.1 DATA DA MEDIÇÃO:

3.2 NUMERO DA MEDIÇÃO:

Valor a pagar da medição (R\$):

(Trinta e Dois Mil Novecentos Reais e Quarenta e Seis Centavos)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MA


DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO



4 GRÁFICOS DE ACOMPANHAMENTO

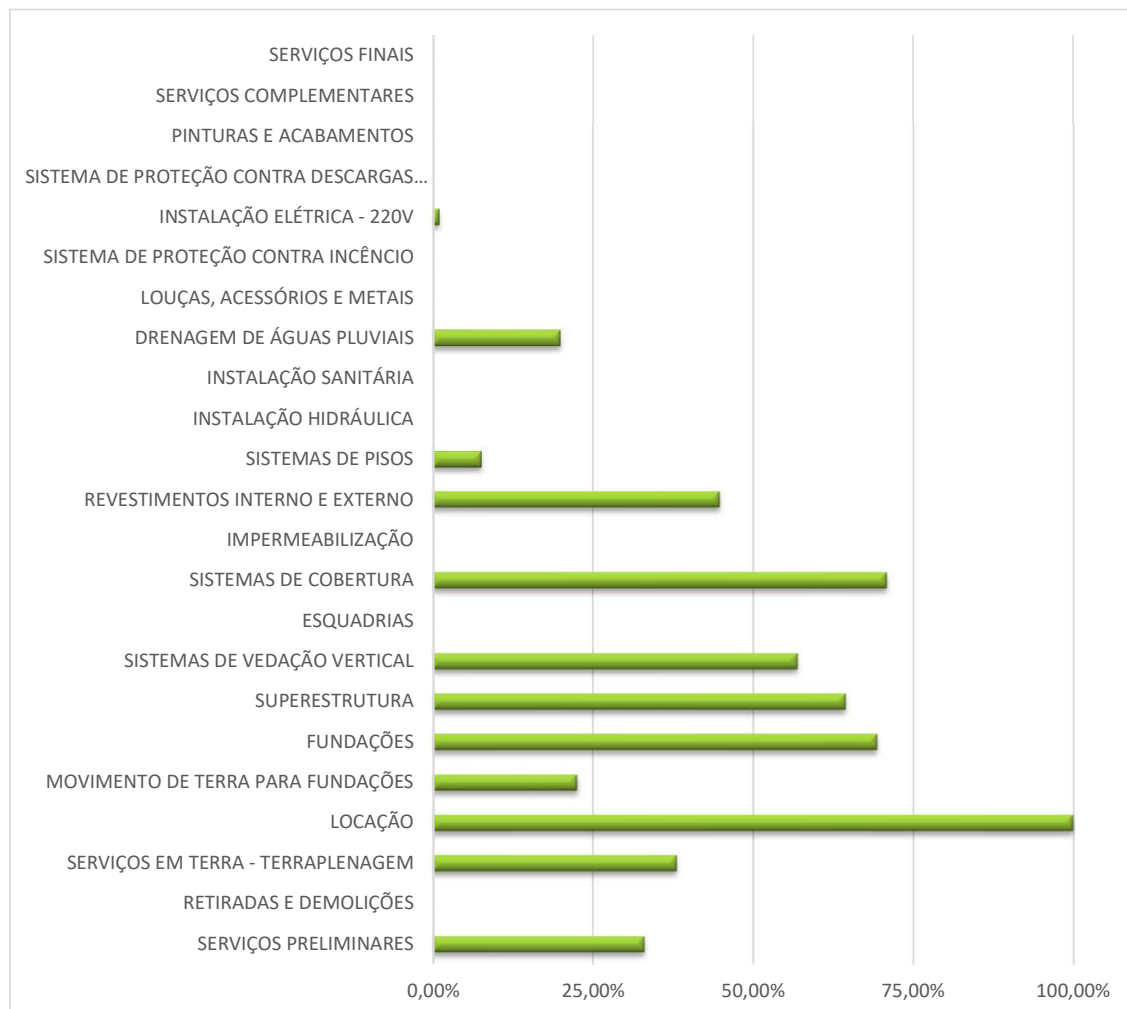



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO




5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de arquibancada.



Execução de arquibancada.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA


RELATÓRIO DE MEDIÇÃO




5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

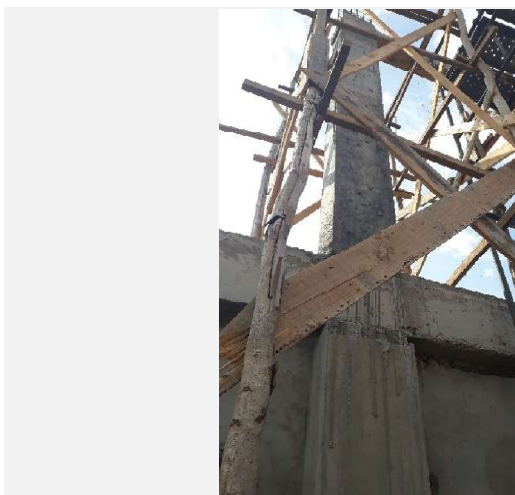

Execução de pilares.

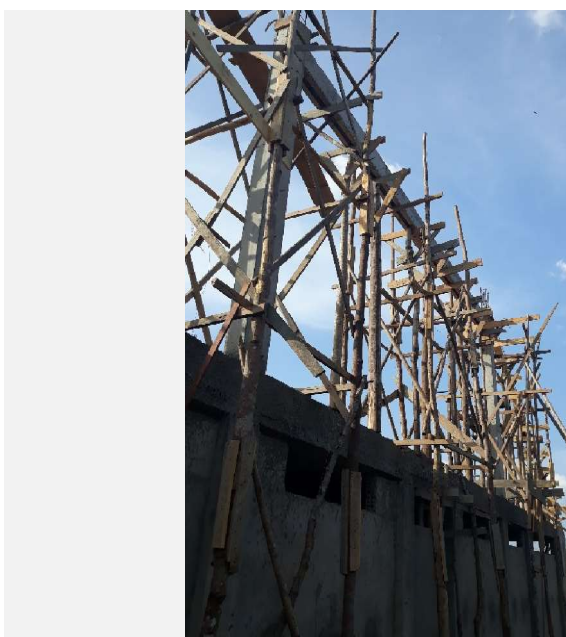

Execução de formas para vigas.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO




5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

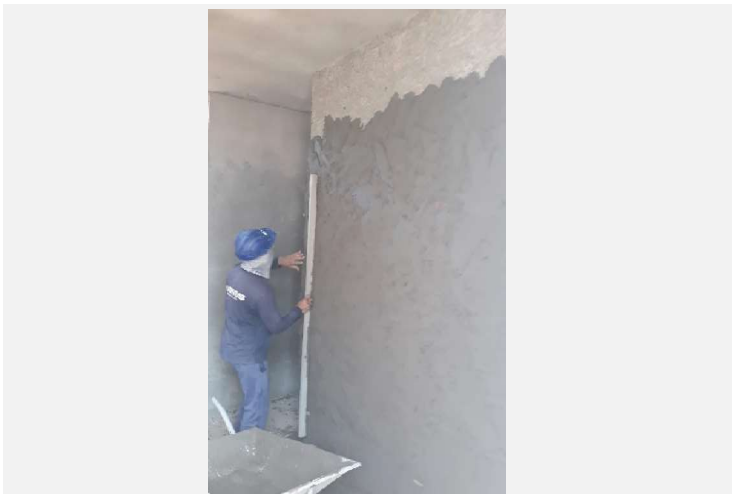

Execução de emboço interno.



Execução de emboço interno.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTR


RELATÓRIO DE MEDIÇÃO



5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

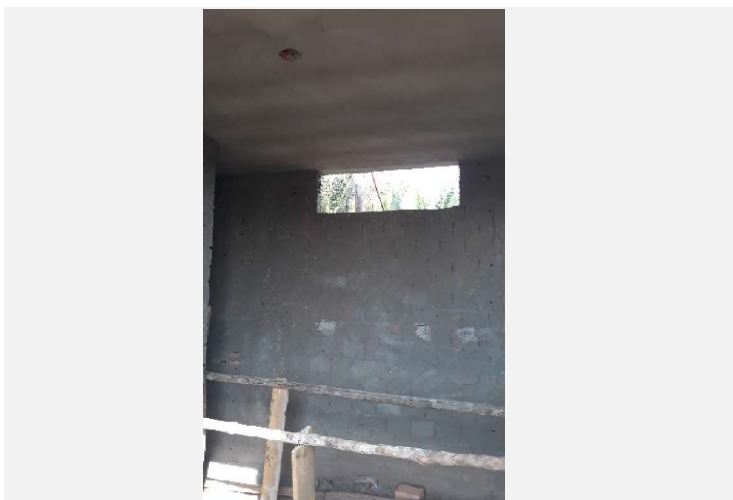


Execução de reboco para laje.

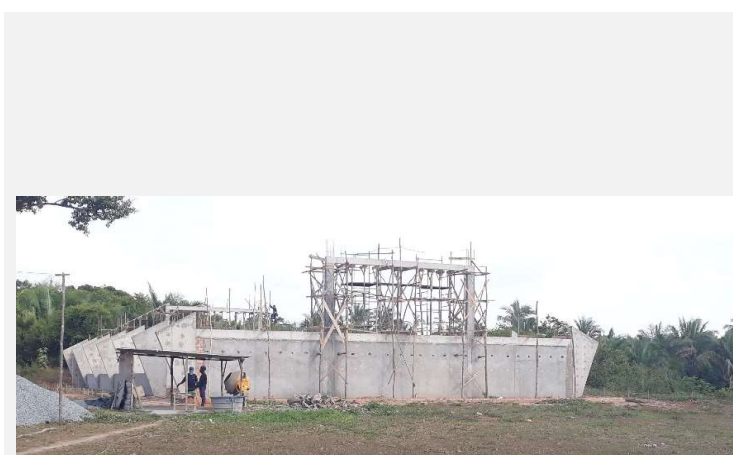

Vista geral da obra.

15,5

6



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA - DINFRA

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO



6 ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (cronograma revisado em 06/03/2023)

	Valor Total	R\$ 1.427.544,18	% EXEC.		FINANCEIRO
MEDIÇÕES	DATA	VALOR MEDIDO	REAL	PREVISTO	SALDO OBRA
1ª MEDIÇÃO	12.01.2023	R\$ 24.939,90	1,75%	1,75%	R\$ 1.402.604,28
2ª MEDIÇÃO	12.02.2023	R\$ 61.161,70	4,28%	4,30%	R\$ 1.341.442,58
3ª MEDIÇÃO	12.03.2023	R\$ 11.727,95	0,82%	9,59%	R\$ 1.329.714,63
4ª MEDIÇÃO	18.04.2023	R\$ 54.262,17	3,80%	17,19%	R\$ 1.275.452,46
5ª MEDIÇÃO	18.05.2023	R\$ 44.636,87	3,13%	28,09%	R\$ 1.230.815,59
6ª MEDIÇÃO	14.06.2023	R\$ 103.493,70	7,25%	23,23%	R\$ 1.127.321,89
7ª MEDIÇÃO	18.07.2024	R\$ 125.033,56	8,76%	8,46%	R\$ 1.002.288,33
8ª MEDIÇÃO	15.08.2023	R\$ 59.104,21	4,14%	7,39%	R\$ 943.184,12
9ª MEDIÇÃO	20.09.2023	R\$ 32.900,46	2,30%	0,00%	R\$ 910.283,66
			0,00%	-	R\$ 910.283,66
			0,00%	-	R\$ 910.283,66
			0,00%		R\$ 910.283,66
			0,00%		R\$ 910.283,66
			0,00%		R\$ 910.283,66
Acumulado		R\$ 517.260,52	36,23%	100,00%	

7 OBSERVAÇÕES DO FISCAL DA OBRA

--

A execução dos serviços manteve o ritmo desacelerado na execução dos serviços. Apesar de a mão de obra contar com 03 Pedreiros, 03 Serventes, 02 Armadores e 02 Carpinteiros, as atividades não se desenvolveram a contento.

Continua clara a falta de planejamento da execução, já que há operários suficientes para desenvolverem mais de uma atividade simultaneamente.

Solicitamos que a empresa apresente um plano de execução dos serviços com urgência, já que tudo indica que não haverá tempo hábil para a conclusão dos serviços.

Documento Digitalizado Público

Planilha Resumo, Planilha Orçamentária e Relatório Fotográfico dos serviços executados no período da 9ª Medição da Obra da Quadra FNDE_Campus Viana

Assunto: Planilha Resumo, Planilha Orçamentária e Relatório Fotográfico dos serviços executados no período da 9ª Medição da Obra da Quadra FNDE_Campus Viana
Assinado por: Ramom Luiz
Tipo do Documento: Planilha Orçamentária
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

▪ **ARQUITETO E URBANISTA**, em 28/09/2023 11:44:27.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/09/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 635610

Código de Autenticação: 7b1d6948c4





Despacho:

Seguem documentos da empresa Virtus e planilha orçamentária referentes à 9ª medição da Obra da Quadra FNDE -Campus Viana. Favor dar prosseguimento ao trâmite para pagamento.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Ramom Luiz Pavao Ribeiro, Ramom Luiz Pavao Ribeiro - ARQUITETO E URBANISTA, COENG-PROAD, em 28/09/2023 11:51:14.



Despacho:

Ciente. Encaminho os autos ao Fiscal administrativo para proceder com o preenchimento do formulário eletrônico SUAP de ateste/recebimento da parcela/medição, assim como as medições no SUAP e Comprasnet e posterior encaminhamento ao gestor do contrato, referente à 9ª medição do contrato 21/2022, cujo objeto é a execução da quadra FNDE. Lembrando que o pagamento deverá ser efetuado através do empenho nº 2022NE000001 e o empenho 2022NE000002.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Wanderson do Nascimento Pereira, Wanderson do Nascimento Pereira - COORDENADOR(A) - FG2 - CPGP-VNA, DAP-VNA, em 04/10/2023 10:07:36.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS VIANA**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

TERMO DE ATESTE DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO

1. DADOS DO CONTRATO (consultar o Comprasnet Contratos 4.0 ou SUAP)

- ORGÃO: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
 - UASG / UG: 154856
 - TIPO DA LICITAÇÃO: Regime diferenciado de contratação (RDC)
 - Nº DA LICITAÇÃO: 02/2022
 - Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 23249.003015.2022-36
 - Nº DO CONTRATO: 21/2022
 - OBJETO CONTRATADO: Execução de uma quadra tipo 1 FNDE no IFMA Viana
-
- INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/09/2022
 - TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/10/2023 (1º Termo Aditivo)
 - VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.427.544,18

2. DADOS DA NOTA FISCAL OU FATURA (verificar se é eletrônica e possui chave válida)

- Nº DA NOTA FISCAL OU FATURA : 00000148
- MÊS / ANO DE REFERÊNCIA: 08/2023
- RAZÃO SOCIAL DO CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
- CNPJ / CPF DO CONTRATANTE: 10.735.145.0024-80
- RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO: VIRTUS ENGENHARIA LTDA - EPP
- CNPJ / CPF DO CONTRATADO: 31.229.242.0001-85
- DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023
- DATA DE RECEBIMENTO: 27/09/2023
- DATA DE VENCIMENTO:
- PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 10/08/2023 - 17/09/2023
- LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: IFMA Viana-MA
- VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 32.900,46
- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (Descrever os Itens do Contrato):

Serviços de execução de superestrutura (pilares, vigas, vergas e lajes), serviços de emboço, chapisco e reboco de laje, canaletas de drenagem, pavimentação externa, arqui bancada e administração local.

- OBSERVAÇÕES: A obra continua sem expedição do alvará. Após a NOTIFICACAO Nº 11/2023 - CLCC-VNA/DAP-VNA/CAMP-VNA/IFMA que trata da solicitação da apresentação de Alvará de Obra a empresa apresentou resposta ao fato assim como justificativa para atraso e Endosso do Seguro Garantia referente ao 1º Aditivo.

3. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - FISCALIZAÇÃO

- NOME DO RESPONSÁVEL: Wanderson do Nascimento Pereira
- MATRÍCULA SIAPE: 1633086
- CARGO E/OU FUNÇÃO: Auxiliar de Biblioteca/ CPGP
- LOTAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: Campus: CAMP-VNA
- TIPO DE FISCALIZAÇÃO: () TÉCNICA (x) ADMINISTRATIVA () SETORIAL
- REGISTRO E ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS NO PERÍODO DA MEDIÇÃO

Atraso na providência do Alvará de Obra bem como no cronograma de execução.

- VALOR APROVADO: R\$ 32.900,46
- PARECER CONCLUSIVO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO:

Por meio deste instrumento, nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Instrução Normativa N° 05 de 26 de maio de 2017, a fiscalização atesta o recebimento provisório dos serviços executados, após a verificação da sua conformidade em relação às especificações do Projeto Básico/Termo de Referência e cláusulas do contrato. O recebimento provisório não exclui ou diminui as responsabilidades civis da contratada pela solidez e segurança dos serviços prestados, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos em lei ou contrato.

ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA FISCALIZAÇÃO

(assinado eletronicamente)

Wanderson do Nascimento Pereira
Responsável pela Fiscalização Administrativa

Documento assinado eletronicamente por:

- **Wanderson do Nascimento Pereira, COORDENADOR(A) - FG2 - CPGP-VNA**, em 05/10/2023 14:33:13.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 05/10/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 719883

Código de Autenticação: 5854dd4bd2



Contrato	00021/2022		
Tipo Lista	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Tipo de Instrumento	Nota Fiscal		
Arquivo	Baixar (https://contratos.comprasnet.gov.br/storage/contratofatura/2023/10/3f1ca3b34e7bf492bf6eddfa1e3bd8f0)		
Justificativa			
Doc. Origem Siafi			
Número	148		
Chave NFe			
Dt. Emissão	27/09/2023		
Dt. Limite de Pagamento	20/10/2023		
Valor	R\$ 32.900,46		
Juros	R\$ 0,00		
Multa	R\$ 0,00		
Glosa	(R\$ 0,00)		
Valor Faturado	R\$ 32.900,46		
Processo	23249.053895/2023-72		
Dt. Recebimento	28/09/2023		
Dt. Liquidação de Despesa	05/10/2023		
Dt. Prazo Pagto.	20/10/2023		
Empenhos	2022NE000001, 2022NE000002		
Repactuação	Não		
Informações Complementares			
Ano / Mês Referência	Ano	Mês	Valor
	2023	09	32.900,46
Situação	Pendente		

Mesref

Anoref

Contratohistorico 0

Tipo de
instrumento de
cobranca 441

Arquivo do
instrumento de
cobranca contratofatura/2023/10/3f1ca3b34e7bf492bf6eddfa1e3 ⓘ

Valorfaturado 32900.46

Valor antigo

Ações [!\[\]\(56d456ce23fbc6d691f6e596f1c162cb_img.jpg\) \(https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/meus-contratos/159914/faturas/214076/edit\)](https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/meus-contratos/159914/faturas/214076/edit)

Documento Digitalizado Público

Instrumento de Cobrança ComprasNet

Assunto: Instrumento de Cobrança ComprasNet
Assinado por: Wanderson Pereira
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR(A) - FG2 - CPGP-VNA**, em 05/10/2023 14:52:42.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/10/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 642760

Código de Autenticação: ff701d8f4b





Despacho:

Ciente e recebido pelo Fiscal Administrativo da obra de construção da quadra poliesportiva padrão FNDE Tipo 1 no IFMA Campus Viana (Contrato nº 21/2022, celebrado entre o Instituto Federal do Maranhão e a empresa Virtus Engenharia Ltda-EPP CNPJ Nº 31.229.242/0001-85). Seguindo a diretrizes indicadas na INSTRUÇÃO NORMATIVA No 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 sobre a Fiscalização Administrativa da citada obra, foram analisados os documentos apresentados pela Contratada para a 9ª Medição dos Serviços. Encaminho o processo junto ao Termo de Ateste de Recebimento e ao Instrumento de Cobrança, ao Gestor Setorial do Contrato para a devida análise e posterior seguimento para pagamento de Medição, conforme requer o trâmite.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Wanderson do Nascimento Pereira, Wanderson do Nascimento Pereira - COORDENADOR(A) - FG2 - CPGP-VNA, CPGP-VNA, em 05/10/2023 14:53:41.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.229.242/0001-85 DUNS®: 947492189
Razão Social: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: VIRTUS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/10/2023
FGTS	Validade:	22/10/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/03/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2023
Receita Municipal	Validade:	30/12/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/04/2024
-----------	------------

Documento Digitalizado Público

Declaração SICAF

Assunto: Declaração SICAF
Assinado por: Adriano Everton
Tipo do Documento: Declaração
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **COORDENADOR(A) - FG2 - CLCC-VNA**, em 05/10/2023 15:19:29.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/10/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 642827
Código de Autenticação: 7b36f65eec





Despacho:

Sra. Contadora Lucilene, após a fiscalização técnica e administrativa encaminho o processo para ciência e demais procedimentos que o caso requer. A declaração SICAF encontra-se válida e os documentos trabalhistas serão cobrados pela fiscalização administrativa e assim que o processo retornar estaremos anexando os documentos em questão.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Adriano Freire Everton, Adriano Freire Everton - COORDENADOR(A) - FG2 - CLCC-VNA, CLCC-VNA, em 05/10/2023 15:24:47.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.229.242/0001-85**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VIRTUS ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF

Documento Digitalizado Público

Consulta Optantes Simples Nacional

Assunto: Consulta Optantes Simples Nacional
Assinado por: Lucilene Melo
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CONTADOR**, em 06/10/2023 09:37:40.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/10/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 643497

Código de Autenticação: 971b60be5f





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CAMPUS VIANA

À CEOF

Sob aspectos contábeis e mediante o ateste do fiscal do contrato, o presente processo nº 23249.053895.2023-72, referente à nota fiscal nº 148 da empresa Virtus Engenharia Ltda, encontra-se APTO para apropriação e pagamento. Abaixo segue quadro de retenções.

RECOLHEDOR - CNPJ	CÓDIGO	TRIBUTO	%	VALOR BASE	VALOR A RETER
31.229.242/0001-85	6147	DIVS	5.85%	32,900.46	1,924.68
31.229.242/0001-85	1162	INSS	11.00%	14,126.32	1,553.89
31.229.242/0001-85		ISSQN	5.00%	19,740.28	987.01
VALOR LIQUIDO A PAGAR =					28,434.88

NOTA 1: Recolher o ISS para o município de VIANA, conforme Lei 116/2003.

NOTA 2: DIVS a recolher com base em anexo da IN RFB nº 1234, e de acordo com a IN RFB

NOTA 3: O INSS retido deve ser recolhido na situação DDF021

(Assinado eletronicamente)

Documento Digitalizado Público

Liquidação Contábil

Assunto: Liquidação Contábil
Assinado por: Lucilene Melo
Tipo do Documento: Ficha Cálculo Pagamento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CONTADOR**, em 06/10/2023 09:53:22.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/10/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 643521

Código de Autenticação: 83f758414d





**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Maranhão

Despacho:

Segue processo para apropriação, referente NF 148 da empresa Virtus Engenharia Ltda, conforme 9ª Medição dos serviços .
Prezada Ceof, observe o Despacho: #624819.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Lucilene Rodrigues de Melo, Lucilene Rodrigues de Melo - CONTADOR, CONT-VNA, em 06/10/2023 10:02:34.

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
06/10/23 15:00 NS USUARIO : JEANE
DATA EMISSAO : 06Out23 VALORIZACAO : 06Out23 NUMERO : 2023NS000956
UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - IFMA/CAMPUS VIANA
FAVORECIDO : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000124 DATA VENCIMENTO : 09Out23

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO NFS-e N°00148 DA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A OBRA D
E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFMA-CAMPUS VIANA, CONFORME PROCESSO N
° 23249.053895.2023-72.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64361870306 - JEANE UG : 154856 06Out23 14:37
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

06/10/23 15:00 NS USUARIO : JEANE
DATA EMISSAO : 06Out23 VALORIZACAO : 06Out23 NUMERO : 2023NS000956
UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - IFMA/CAMPUS VIANA
FAVORECIDO : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000124 DATA VENCIMENTO : 09Out23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401005	2022NE000001		44905199	22.346,58
02	591700	31229242000185	812310201		32.900,46
03	521214	2022NE000001	213110400	44905199	22.346,58
04	551002	2022NE000001	123210601	44905199	22.346,58
		IM22VNA01			22.346,58
05	401005	2022NE000002		44905191	10.553,88
06	521214	2022NE000002	213110400	44905191	10.553,88

LANCADO POR : 64361870306 - JEANE UG : 154856 06Out23 14:37
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

APROPRIAÇÃO

Assunto: APROPRIAÇÃO
Assinado por: Jeane Gomes
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR(A) - FG2 - CEOF-VNA**, em 06/10/2023 15:04:59.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/10/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 644129
Código de Autenticação: 8ebdafd0b9



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
16/10/23 17:24 USUARIO : JEANE
DATA EMISSAO : 09Out23 TIPO OB: 59 NUMERO : 2023OB800574
UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - IFMA/CAMPUS VIANA
BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 154856/26408/2023NP000124 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005374937-5 PROCESSO : 23249.053895.2023-72
VALOR : 987,01

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2023LF000070
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/10/23
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFSE N°00148 DA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, REFERENT
E A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFMA-CAMPUS VIANA, CONFORME
PROCESSO N° 23249.053895.2023-72.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

16/10/23 17:24

USUARIO : JEANE

DATA EMISSAO : 09Out23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800574

UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - IFMA/CAMPUS VIANA

BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 987,01

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORC

VALOR

01 401006 2022NE000001405

44905199

987,01

02 531741 2022NE000001

987,01

03 561602 1000000000405D

987,01

LANCADO POR : 60375858300 - LUCAS

UG : 154856 09Out23 11:40

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
16/10/23 17:24 USUARIO : JEANE
DATA EMISSAO : 09Out23 TIPO OB: 12 NUMERO : 2023OB800575
UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - IFMA/CAMPUS VIANA
BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 3649 CONTA CORRENTE : 520934
DOCUMENTO ORIGEM : 154856/26408/2023NP000124 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005374938-3 PROCESSO : 23249.053895.2023-72
VALOR : 28.434,88

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/10/23
LIQUIDAÇÃO NFS-E N°00148 DA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A OBRA D
E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFMA-CAMPUS VIANA, CONFORME PROCESSO N
º 23249.053895.2023-72.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

16/10/23 17:24

USUARIO : JEANE

DATA EMISSAO : 09Out23 TIPO OB: 12

NUMERO : 2023OB800575

UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - IFMA/CAMPUS VIANA

BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 3649 CONTA CORRENTE : 520934

VALOR : 28.434,88

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2022NE000001405		44905199	
----	--------	-----------------	--	----------	--

17.881,00

02	401006	2022NE000002400		44905191	
----	--------	-----------------	--	----------	--

10.553,88

03	531814	2022NE0000001	213110400	44905199	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

17.881,00

04	531814	2022NE0000002	213110400	44905191	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

10.553,88

05	561602	10000000000400D			
----	--------	-----------------	--	--	--

10.553,88

06	561602	10000000000405D			
----	--------	-----------------	--	--	--

17.881,00

LANCADO POR : 60375858300 - LUCAS UG : 154856 09Out23 11:40

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

PAGAMENTO E RECLHIMENTO DE ISS

Assunto: PAGAMENTO E RECLHIMENTO DE ISS
Assinado por: Jeane Gomes
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR(A) - FG2 - CEOF-VNA**, em 16/10/2023 17:28:50.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/10/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 651154
Código de Autenticação: 1376b970c7



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____

16/10/23 17:20

USUARIO : JEANE

DATA EMISSAO : 09Out23 VENCIMENTO: 09Out23 NUMERO : 2023DF800131

UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - IFMA/CAMPUS VIANA

CONTRIBUINTE : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 154856 / 26408 / 2023NP000124

PERIODO APURACAO : 09Out23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 32900,46

RECEITA : 1.924,68

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 09/10/23

TOTAL : 1.924,68

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6385

RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE NFSe N°00148 DA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFMA-CAMPUS VIANA, CONFORME PROCESSO N° 23249.053895.2023-72.

LANCADO POR : 64361870306 - JEANE UG : 154856 09Out23 11:00

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS

Assunto: RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS
Assinado por: Jeane Gomes
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **COORDENADOR(A) - FG2 - CEOF-VNA**, em 16/10/2023 17:29:59.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/10/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 651158
Código de Autenticação: a9b1e05b6e





Despacho:

Prezado Coordenador, encaminho o presente processo para regularização de documentações conforme despacho contadora, assim que for resolvido peço que seja devolvido para esta coordenaria para anexar guia de iss.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Jeane Santos Gomes Serra, Jeane Santos Gomes Serra - COORDENADOR(A) - FG2 - CEOF-VNA, CEOF-VNA, em 16/10/2023 17:33:46.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Maranhão

Despacho:

Sr. Fiscal Administrativo Wanderson, encaminho o processo para anexar a documentação trabalhista e observar a solicitação do Despacho: #631974

Despacho assinado eletronicamente por:

- Adriano Freire Everton, Adriano Freire Everton - COORDENADOR(A) - FG2 - CLCC-VNA, CLCC-VNA, em 17/10/2023 09:18:45.

CAMPUS VIANA
Coord. de Planejamento e Gestão Patrimonial - Campus Viana - CPGP-VNA

NOTIFICACAO N° 1/2023

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA-EPP/ **CNPJ:** 31.229.242/0001-85

Endereço: Av. Colares Moreira, nº 03, Edif. Business Center, Sala 906, Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP 65.075-441

E-mail: engenhariavirtus@gmail.com

REF: Termo de Contrato N° 21/2022/IFMA CAMPUS VIANA

AT.TE: ÁLVARO VICENTE BATISTA NOVAIS - Sócio Administrador

NOTIFICA

A VIRTUS ENGENHARIA LTDA-EPP/ CNPJ: 31.229.242/0001-85:

Para, no prazo de **2 (dois) dias uteis**, apresentar, os esclarecimentos referente a notificação, sob pena de abertura de processo administrativo para possível aplicação de penalidade nos termos do Art.87 da Lei 8.666/1993, bem como nas cláusulas contratuais firmados com esta empresa.

1. Solicitamos o envio dos documentos trabalhistas conforme **PARECER N° 4/2023 - CPGP-VNA/DAP-VNA/CAMP-VNA/IFMA**
2. Onde estiver assinalado **NÃO** na planilha. Apresentar os documentos correspondentes.

Viana/MA, 17 de outubro de 2023

Wanderson do Nascimento Pereira

SIAPE: 1633086
Fiscal Administrativo do Contrato N° 21/2022
IFMA - Campus Viana

Documento assinado eletronicamente por:

- **Wanderson do Nascimento Pereira, COORDENADOR(A) - FG2 - CPGP-VNA**, em 17/10/2023 09:50:00.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/10/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 725365

Código de Autenticação: 915a164392



Instituto Federal do Maranhão - IFMA

Endereço: Rodovia MA 014, Km 48, SN, Povoado São Pedro, Viana -MA, None, None, VIANA / MA, CEP 65215-000

Fone: None - Site: www.ifma.edu.br

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS VIANA**

Coord. de Planejamento e Gestão Patrimonial - Campus Viana - CPGP-VNA

PARECER N° 4/2023 - CPGP-VNA/DAP-VNA/CAMP-VNA/IFMA

VIANA, 17 DE OUTUBRO DE 2023

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM USO EXCLUSIVO DE MÃO-DE-OBRA (TERCEIRIZAÇÃO)						
Item	Documento	Início do Contrato	Mensal	Anual	Periódico	Norma Legal
01	Convenção Coletiva/Acordo/Sentença Normativa		-			Artigo 8º CLT e alínea "j" do inciso I do art. 34 e 37 seguintes IN 02/2008-MPOG
02	Registro dos Empregados		-			Art. 41, CLT e item 1.2 do Anexo IV da IN 02/2008
03	CTPS		-			Art 29, CLT e item 1.2 do Anexo IV da IN 02/2008
04	ASO Admissional		-			NR 07 MTE, art. 168, CLT e alínea "g" do inciso I do art 34 IN 02/2008
05	ASO Periódico		-			NR 07 MTE, art 168 CLT e alínea "g" do inciso I do art 34 IN 02/2008

06	ASO Retorno/Alteração de Função		-			NR 07 MTE, art 168 CLT e alínea "g" do inciso I do art 34 IN 02/2008
07	ASO Demissional		-			NR 07 MTE, art 168 CLT e alínea "g" do inciso I do art 34 IN 02/2008
08	Contrato de Trabalho		-			Art 8, CLT e item 1.2 do anexo IV IN 02/2008

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM USO EXCLUSIVO DE MÃO-DE-OBRA (TERCEIRIZAÇÃO)

Item	Documento	Início do Contrato	Mensal	Anual	Periódico	Norma Legal
09	Vale-transporte		não			Lei 7.418/85 e alínea "d" do inciso I do art 34 e item 2.3 do anexo IV da IN 02/2008
10	Auxílio-alimentação		não			alínea "d" do inciso I do art 34 e item 2.3 do anexo IV da IN 02/2008
11	Controle da Jornada de Trabalho		não			Art 74 CLT e item 2.2 do anexo IV da IN 02/2008
12	Cesta básica		não			
13	Recibo do pagamento do seguro de vida		não			
14	Recibo do Pagamento dos Salários e Benefícios		não			Art 459, CLT , alínea "c" do inciso I do art 34 e item 2.3 do anexo IV da IN 02/2008
15	Décimo Terceiro Salário		-			Leis 4090/62 e 4749/65, alínea "e" do inciso I do art 34 IN 02/2008
16	Cursos e Treinamentos		-			alínea "h" do inciso I do art 34 da IN 02/2008

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM USO EXCLUSIVO DE MÃO-DE-OBRA (TERCEIRIZAÇÃO)

Item	Documento	Início do Contrato	Mensal	Anual	Periódico	Norma Legal
17	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados- CAGED		não			Lei 4923/65, alínea "i" do inciso I do art 34 IN 02/2008
18	Relação Anual de Informações Sociais – RAIS		não			Decreto 76.900/75 e alínea "i" do inciso I do art 34 IN 02/2008
19	Guia de Recolhimento de FGTS-GRF		não			Lei 9528/97, alínea "b", inciso I do art 34 e alínea b do item 2.5 do anexo IV IN 02/2008
20	Guia da Previdência Social-GPS		não			Art 195, § 3º CF, lei 8212/91, art 31 e seguintes e alínea "a", art 34 e alínea c do item 2.6 do anexo IV IN 02/2008
21	GFIP/SEFIP(Relação de Empregados-RE, Relação Tomadores/Obras-RET, Protocolo de Envio de Arquivo e Comprovante de Declaração à Previdência)		não			Lei 9528/97, art 34 e itens 2.5 e 2.6 do anexo IV da IN 02/2008
22	Certidão Negativa de Débitos Previdenciários CND		sim			Lei 8212/91, art 31 e item 2.8 do anexo IV da IN 02/2008
23	Certidão de Regularidade do FGTS – CRF		não (validade 30 dias)			Lei 8036, art 27 e item 2.8 do anexo IV da IN 02/2008

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM USO EXCLUSIVO DE MÃO-DE-OBRA (TERCEIRIZAÇÃO)

Item	Documento	Início do Contrato	Mensal	Anual	Periódico	Norma Legal
24	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – GRRF		-			Lei 9491/97, item 7.1 e 8 do anexo VI da IN 02/2008***

25	Aviso Prévio		-			Art 487 CLT item 7.1 e 8 do anexo VI da IN 02/2008****
26	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho homologado		-			Art 477 CLT IN TEM SRT 03/2002 e item 7.1 e 8 do anexo VI da IN 02/2008*****
27	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA		-			NR 09
28	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO		-			NR 07
29	Laudo de Insalubridade		-			NR 15
30	CIPA		-			NR-5
31	Equipamentos de Proteção Individual		sim			Art 166 CLT, NR-6 e NR -18
32	Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT		não			Lei 8213/91, art 22
33	Salário Família		não			Lei 8213/91, art 67
34	Nota Fiscal de Serviços – retenção de 11%		-			Lei 8212/91, art 31 e item 2.4 do anexo IV da IN 02/2008
35	Folha de Pagamento		não			Lei 8212/91, art 32, inciso I e item 1.1 do anexo IV da IN 02/2008

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Wanderson do Nascimento Pereira
Fiscal Administrativo do Contrato N° 21/2022

Documento assinado eletronicamente por:

- **Wanderson do Nascimento Pereira, COORDENADOR(A) - FG2 - CPGP-VNA**, em 17/10/2023 09:47:07.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/10/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 725370

Código de Autenticação: ee126513ee



Notificação-Documentações Trabalhistas

1 mensagem

Wanderson do Nascimento Pereira <wanderson.pereira@ifma.edu.br>

17 de outubro de 2023 às 09:59

Para: engenhariavirtus@gmail.com

Cc: Raimundo Nonato Pinheiro Correa Filho <nonato.correa@ifma.edu.br>, Ramom Luiz Pavão Ribeiro <ramom.ribeiro@ifma.edu.br>, Adriano Freire Everton <adriano.everton@ifma.edu.br>, Hawllyson Rocha Costa <hawllyson.costa@ifma.edu.br>, Lucilene Rodrigues de Melo <lucilene.melo@ifma.edu.br>, Luis Alex Guida de Miranda <luis.miranda@ifma.edu.br>

À Virtus,

Envio em anexo a NOTIFICAÇÃO N° 1/2023 - CPGP-VNA/DAP-VNA/CAMP-VNA/IFMA que trata da solicitação da apresentação dos documentos trabalhistas.

Atenciosamente.

Wanderson do Nascimento Pereira
CPGP do Campus Viana / Fiscal Administrativo do Contrato n° 21/2022
IFMA VIANA/ SIAPE 1633086

2 anexos



Notificação Virtus.pdf

70K



Parecer n° 4.pdf

117K

Documento Digitalizado Público

E-mail de notificação

Assunto: E-mail de notificação
Assinado por: Wanderson Pereira
Tipo do Documento: E-mail
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR(A) - FG2 - CPGP-VNA**, em 17/10/2023 10:02:17.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/10/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 651501

Código de Autenticação: c4e63bd5b8



00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000113 BERNARDO SERRA				PEDREIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.973,40		
604	Vale Transporte			118,40	
903	INSS Folha			157,80	
			1.973,40	276,20	
			Valor Líquido	1.697,20	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.973,40	1.973,40	8,00	1.973,40	157,87	1.445,40
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000113 BERNARDO SERRA				PEDREIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.973,40		
604	Vale Transporte			118,40	
903	INSS Folha			157,80	
			1.973,40	276,20	
			Valor Líquido	1.697,20	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.973,40	1.973,40	8,00	1.973,40	157,87	1.445,40
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000138 GILSON CARLOS DA SILVA RIBEIRO				PEDREIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.973,40		
903	INSS Folha			157,80	
			1.973,40	157,80	
			Valor Líquido	1.815,60	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.973,40	1.973,40	8,00	1.973,40	157,87	1.445,40
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000138 GILSON CARLOS DA SILVA RIBEIRO				PEDREIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.973,40		
903	INSS Folha			157,80	
			1.973,40	157,80	
			Valor Líquido	1.815,60	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.973,40	1.973,40	8,00	1.973,40	157,87	1.445,40
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000141 HERBETH RIBEIRO				SERVENTE DE OBRAS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.394,40		
903	INSS Folha			105,69	
			1.394,40	105,69	
			Valor Líquido	1.288,71	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,40	1.394,40	7,58	1.394,40	111,55	866,40
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000141 HERBETH RIBEIRO				SERVENTE DE OBRAS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.394,40		
903	INSS Folha			105,69	
			1.394,40	105,69	
			Valor Líquido	1.288,71	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,40	1.394,40	7,58	1.394,40	111,55	866,40
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000127 JOSE RIBAMAR GOMES CANTANHEDE				ENCARREGADO DE OBRA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		3.000,00		
903	INSS Folha			263,05	
914	IRRF Folha			18,43	
			3.000,00	281,48	
			Valor Líquido	2.718,52	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	8,77	3.000,00	240,00	2.357,77
7,50					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000127 JOSE RIBAMAR GOMES CANTANHEDE				ENCARREGADO DE OBRA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		3.000,00		
903	INSS Folha			263,05	
914	IRRF Folha			18,43	
			3.000,00	281,48	
			Valor Líquido	2.718,52	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	8,77	3.000,00	240,00	2.357,77
7,50					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000098 LUIS ALBERTO DE BRITO COSTA				ARMADOR	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.973,40		
604	Vale Transporte			118,40	
903	INSS Folha			157,80	
			1.973,40	276,20	
			Valor Líquido	1.697,20	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.973,40	1.973,40	8,00	1.973,40	157,87	1.445,40
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000098 LUIS ALBERTO DE BRITO COSTA				ARMADOR	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.973,40		
604	Vale Transporte			118,40	
903	INSS Folha			157,80	
			1.973,40	276,20	
			Valor Líquido	1.697,20	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.973,40	1.973,40	8,00	1.973,40	157,87	1.445,40
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000140 MARCO ANTONIO DE ARAUJO SOUSA				SERVENTE DE OBRAS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.394,40		
903	INSS Folha			105,69	
			1.394,40	105,69	
			Valor Líquido	1.288,71	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,40	1.394,40	7,58	1.394,40	111,55	866,40
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000140 MARCO ANTONIO DE ARAUJO SOUSA				SERVENTE DE OBRAS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.394,40		
903	INSS Folha			105,69	
			1.394,40	105,69	
			Valor Líquido	1.288,71	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,40	1.394,40	7,58	1.394,40	111,55	866,40
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000129 TAYLON CRUZ MEIRELES				SERVENTE DE OBRAS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.394,80		
903	INSS Folha			105,73	
Felicidades no seu Aniversário.			1.394,80	105,73	
			Valor Líquido	1.289,07	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,80	1.394,80	7,58	1.394,80	111,58	866,80
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000129 TAYLON CRUZ MEIRELES				SERVENTE DE OBRAS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.394,80		
903	INSS Folha			105,73	
Felicidades no seu Aniversário.			1.394,80	105,73	
			Valor Líquido	1.289,07	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,80	1.394,80	7,58	1.394,80	111,58	866,80
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000139 VALTENIR BARROS SILVA				PEDREIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.973,40		
398	Faltas em Dias	000,01		0,66	
903	INSS Folha			157,74	
056	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00		65,78	
			1.973,40	224,18	
			Valor Líquido	1.749,22	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.973,40	1.972,74	8,00	1.972,74	157,81	1.444,74
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/09/2023 a 30/09/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000139 VALTENIR BARROS SILVA				PEDREIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.973,40		
398	Faltas em Dias	000,01		0,66	
903	INSS Folha			157,74	
056	Desconto de DSR Sobre Faltas	001,00		65,78	
			1.973,40	224,18	
			Valor Líquido	1.749,22	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.973,40	1.972,74	8,00	1.972,74	157,81	1.444,74
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331710067599151
17/10/2023 10:14:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
3649803649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIRTUS ENGENHARIA LTDA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0768-4 - SANTA INES

CONTA: 46.343-2

FAVORECIDO: JOSE RIBAMAR GOMES CANTANHEDE

CPF/CNPJ: 251.013.403-59

VALOR: R\$ 2.718,52

DEBITO EM: 04/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100429

AUTENTICACAO SISBB: 6.43C.2FA.161.85D.015

=====

Chegou o momento mais esperado da MPE Week!

A hora de aproveitar as ofertas pra sua empresa.

Confira ate 31/10 em ofertasmpeweek.bb.com.br.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
3649803649 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004151157201246896
CNPJ DO PAGADOR: 31.229.242/0001-85
VALOR: 1.697,20
DATA: 04/10/2023 - 12:12:31

PAGO PARA: Bernardo Serra
CPF: ***.723.253-**
CHAVE PIX: +5598970185807
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000116921161
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 12:12:33

=====

DOCUMENTO: 100435
AUTENTICACAO SISBB: 7.9E2.5E0.2C7.B26.E28

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
3649803649 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004151634813998098
CNPJ DO PAGADOR: 31.229.242/0001-85
VALOR: 1.289,07
DATA: 04/10/2023 - 12:17:03

PAGO PARA: Taylon Cruz Meireles
CPF: ***.518.203-**
CHAVE PIX: 61151820342
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000066892662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 12:17:05

=====

DOCUMENTO: 100437
AUTENTICACAO SISBB: 3.CF0.942.101.C0D.2E2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
3649803649 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004151804982770147
CNPJ DO PAGADOR: 31.229.242/0001-85
VALOR: 1.815,60
DATA: 04/10/2023 - 12:18:34

PAGO PARA: Gilson C S Ribeiro
CPF: ***.179.323-**
CHAVE PIX: sgilsoncarlos01@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000845637705
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 12:18:35

=====

DOCUMENTO: 100438
AUTENTICACAO SISBB: D.7AC.0BB.8F7.787.052

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
3649803649 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004151914716444756
CNPJ DO PAGADOR: 31.229.242/0001-85
VALOR: 1.749,22
DATA: 04/10/2023 - 12:19:43

PAGO PARA: Valtenir B Silva
CPF: ***.910.603-**
CHAVE PIX: 01491060336
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3495 - CONTA: 12880000007846799380
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 12:19:44

=====

DOCUMENTO: 100439
AUTENTICACAO SISBB: 3.D5F.DF4.7F5.D16.E85

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
3649803649 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004152504232884218
CNPJ DO PAGADOR: 31.229.242/0001-85
VALOR: 1.288,71
DATA: 04/10/2023 - 12:25:46

PAGO PARA: Marco A Araujo Sousa
CPF: ***.652.263-**
CHAVE PIX: 61965226396
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009320946758
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 12:25:47

=====

DOCUMENTO: 100441
AUTENTICACAO SISBB: D.BF6.E18.994.35B.430

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
3649803649 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004152707494644720
CNPJ DO PAGADOR: 31.229.242/0001-85
VALOR: 1.288,71
DATA: 04/10/2023 - 12:27:38

PAGO PARA: Herbeth Ribeiro
CPF: ***.896.863-**
CHAVE PIX: +5594992053070
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0905 - CONTA: 0000000000000383198
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 12:27:39

=====

DOCUMENTO: 100442
AUTENTICACAO SISBB: 6.B4B.6D6.2C5.EEC.BCD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:36
3649003649

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 31.229.242/0001-85

FAVORECIDO: LUIS ALBERTO DE BRITO COS
CPF: 242.766.693-91
AGENCIA: 2954-8 - RENASCENCA MA
CONTA: 65.234-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.697,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.997.80D.709.66E.3EF

Transação efetuada com sucesso por: JC711289 ALVARO VICENTE BATISTA NOVAIS.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/10/2023 - 18:03:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIRTUS ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0989) 88232164
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 106.188,32	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 31.229.242/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 11/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.495,06	14-ENCARGOS 468,64	15-TOTAL A RECOLHER 8.963,70
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/10/2023

858000000895 637001802310 011681184839 122924200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/10/2023 - 18:03:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIRTUS ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0989) 88232164
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 106.188,32	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 31.229.242/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 11/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.495,06	14-ENCARGOS 468,64	15-TOTAL A RECOLHER 8.963,70
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/10/2023

858000000895 637001802310 011681184839 122924200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3371017587986071
10/10/2023 18:10:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.10.18
3649803649

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4
EFETUADO POR: ALVARO V B NOVAIS

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000089-5 63700180231-0
01168118483-9 12292420001-1
Data do pagamento 10/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 31229242/0001-85
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 11/10/2023
VALOR DEPOSITO 8.963,70
Valor Total 8.963,70

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC711289 ALVARO VICENTE BATISTA NOVAIS.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	31.229.242/0001-85
Nome	VIRTUS ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	09/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	57885264 / Reinf CP 22136371909 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 10.086,60	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 26.825,63	R\$ 24.301,81
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.165,24	R\$ 7.165,24
IRRF	R\$ 196,54	R\$ 196,54
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 44.274,01	R\$ 31.663,59

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ALVARO VICENTE BATISTA NOVAIS
CPF	005.904.223-08
Telefone	3521-3621

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/10/2023 13:42:52
Nº do recibo de entrega	0000050000168832274

Documento Digitalizado Público

Documentos Trabalhistas

Assunto: Documentos Trabalhistas
Assinado por: Wanderson Pereira
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR(A) - FG2 - CPGP-VNA**, em 17/10/2023 10:32:32.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/10/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 651610
Código de Autenticação: 2050b7c3fd





Despacho:

Prezada CEOF-VNA, segue processo com a devida documentação trabalhista anexada.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Wanderson do Nascimento Pereira, Wanderson do Nascimento Pereira - COORDENADOR(A) - FG2 - CPGP-VNA, CPGP-VNA, em 17/10/2023 10:34:39.

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____

25/10/23 15:07

USUARIO : LUCILENE

DARF NUMERADO AGREGADO: 2023DF803785

DATA EMISSAO : 20Out23 VENCIMENTO: 20Out23 NUMERO : 2023DF803921

UG/GESTAO EMITENTE: 158128 / 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO

CONTRIBUINTE : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

RECURSOS : COM LIMITE DE RESTOS A PAGAR

DOC.ORIGEM 154856 / 26408 / 2023NP000124

PERIODO APURACAO : 27Set23

RECEITA : 1162

VALORES BASE DE CALCULO : 14126,32

RECEITA : 1.553,89

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 20/10/23

TOTAL : 1.553,89

OBSERVACAO

RETENCAO DE INSS SOBRE NFSe N 00148 DA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, REFEREN
TE A OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFMA-CAMPUS VIANA, CONFORME
PROCESSO N 23249.053895.2023-72.

LANCADO POR : 79975976387 - JUARIEDSON UG : 158128 20Out23 23:22

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=DARF NUM AGREGADO

PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

Comprovante de recolhimento de INSS

Assunto: Comprovante de recolhimento de INSS
Assinado por: Lucilene Melo
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CONTADOR**, em 25/10/2023 15:11:03.

Este documento foi armazenado no SUAP em 25/10/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 659247

Código de Autenticação: 750dda9bbf





**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Maranhão

Despacho:

Segue processo para conformidade de gestão.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Lucilene Rodrigues de Melo, Lucilene Rodrigues de Melo - CONTADOR, CEOF-VNA, em 25/10/2023 15:11:49.



TERMO DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO

DADOS DO PROCESSO


Número Processo: 23249.053895.2023-72
Setor de Finalização do Processo: DAP-VNA
Data/Hora Finalização do Processo: 27/10/2023 13:28:51

DADOS DO USUÁRIO

Nome: Hawllyson Rocha Costa
Matrícula SIAPE: 2319663
Cargo: ADMINISTRADOR (PCIFE) - 701001
Lotação: CAMP-VNA
Exercício: DAP-VNA

Justificativa

Ciente. Conformidade de Gestão efetuada. Encaminho os autos para arquivamento.



Este documento foi emitido pelo SUAP e validado por :
Hawllyson Costa
