


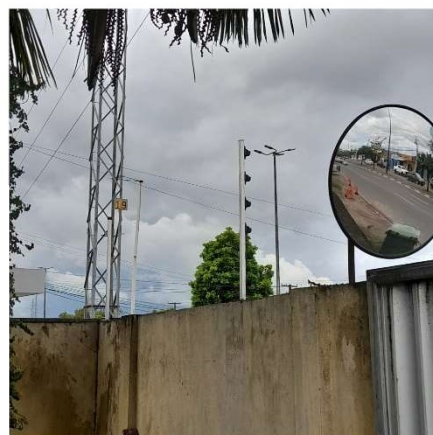


CERCA ELÉTRICA E CONCERTINA 2024

SEI – 02025.02025.000918/2024-81

FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Ordem de serviço nº 35-17/7/2024

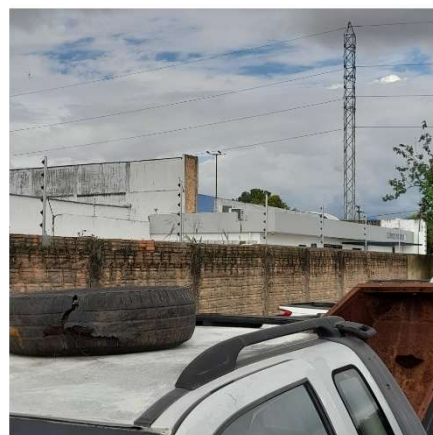

17 DE JULHO DE 2024- REVISÃO - 1

**INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - RR**

Criado por: EMAP-RR
(Edson Avelino Micheloni)



OBRA:	Serviço de instalação de cerca elétrica integrada com concertina de diâmetro mínimo de 45 cm
CONTRATADA:	M. DOS S. RIBEIRO (CNPJ: 3.627.249/0001-80), NORTE CONCERTINAS (Nome de Fantasia)
CONTRATO:	10/2024
NÚMERO SEI:	02025.000396/2023-37
DATA DA VISTORIA:	15 e 16/JULHO/2024
MOTIVAÇÃO:	FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL (LEI 14.133, 1º DE ABRIL DE 2021 E DECRETO 11.246, 2022), ORDEM DE SERVIÇO #35/2024
REFERÊNCIA:	1) TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 19396123) 2) PROPOSTA CONTRATADO (SEI 19587839) 3) ETP (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR) – 6/2024 (SEI 19338312)

1. CRONOLOGIA DAS ATIVIDADES

1.1 - 12/julho/2024:

- ✓ Reunião com o senhor Mateus Ribeiro (NORTE CONCERTINAS) e o servidor Pedro Paulo Salomão para alinhamento da execução de acordo com o aprovado na contratação;

1.2 - 15/julho/2024:

- ✓ Envio da documentação dos funcionários da empresa contratada (em anexo);
- ✓ Início da execução do chumbamento das hastes metálicas conforme item 6.1.1 do ETP 6/2024, intercaladas a cada 3 m, conforme item 3.2.2 (ETP 6/2024) (ver registro fotográfico);
- ✓ Definição do local de instalação das 2 (duas) centrais de acionamento sonoro (sirenes);
- ✓ Identificação de abelhas no local sendo solicitado apoio à DITEC-RR, por meio da servidora Gabriella Carmesita Cardoso;

1.3 - 16/julho/2024:

- ✓ Agendamento para o dia 16/julho, às 13 h, de serviços de quebra de piso e de parede para colocação dos conduítes para passagens de cabos de aterramento, internet e fiação elétrica para as duas sirenes e a Central de Serviços (itens 5.4.4.1 e 5.4.4.3 do TR 6/2024), com posterior

cancelamento devido à avaliação de outros pontos de colocação com possível redução de tempo de instalação (a ser definida em 17/julho/2024);

- ✓ Pré-agendamento com prestador de serviços externo para a retirada das abelhas existentes no pátio posterior, a ser confirmada até o dia 17/julho/2024;
- ✓ Conclusão do chumbamento das hastes metálicas no perímetro da Sede IBAMA-RR;

2. AVALIAÇÃO E COMENTÁRIOS

- ✓ As atividades têm sido desenvolvidas sem grandes percalços, tendo sido já concluída a instalação das hastes metálicas, exceto na área onde estão instaladas as abelhas;
- ✓ Em 17/7/2024, receberemos a visita de terceiro especializado em abelhas (apicultor) de forma a programar a retirada das abelhas fora do expediente usual dos servidores, ou seja, a partir de 17:30 h, minimizando o risco de acidentes. A servidora Gabriella Carmesita Cardoso está na condução desta atividade;
- ✓ Também nesta data deverá ser redefinido melhor local para a instalação das sirenes e central de acionamento;
- ✓ Melhor previsão para encerramento: até 26/julho/2024, dentro do prazo contratual que é dia 30/julho/2024 (item 6.5, ETP 6/2024);

2. ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS ATIVIDADES

- Instalação das hastes metálicas da cerca elétrica espaçadas a cada 3 m



2. ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS ATIVIDADES (continuação)

- Excesso de folhas que poderiam danificar a cerca depois de instalada



- Limpeza parcial das folhas e palmas das árvores



2. ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS ATIVIDADES (continuação)

- Local com presença de abelhas, lado leste em referência à recepção da Supes-RR
(Foto: servidora Gabriella Carmesita)



3. ANEXO – DOCUMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DA NORTE CONCERTINAS

