

OSTENSIVO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA Nº 072/CAE-CISCEA/2020
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/CAE/2019
NUP: 67106.008822/2019-40

A UNIÃO, Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, representada pela Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA, com sede na Avenida General Justo, nº 160 - Prédio da CISCEA, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.429/0133-50, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, Maj Brig Ar SERGIO BARROS DE OLIVEIRA, CPF nº 521.064.626-20, conforme Decreto s/nº, de 29/06/2021, publicado nº Diário Oficial da União nº 121, de 30/06/2021, e a empresa LOPES MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.031.440/0001-92, sediado(a) na Avenida rio Branco, nº 125 - 6º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 35542, expedida pela (o) CREA/RJ, e CPF nº 371.399.917-15, tendo em vista o que consta no processo do PAG Nº 121/GAPCEA/2016 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. **ALTERAR** o valor contratual em mais R\$ 1.495.396,67 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em face do acréscimo e supressão de serviços, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993, elevando o valor contratual para R\$ 69.529.193,63 (sessenta e nove milhões, quinhentos e vinte e nove mil, cento e noventa e três reais e sessenta e três centavos), considerando os aditivos e apostilamentos de reajustes legais.

O S T E N S I V O

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. O valor do presente aditamento é de R\$ 1.495.396,67 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), elevando o valor contratual para R\$ 69.529.193,63 (sessenta e nove milhões, quinhentos e vinte e nove mil, cento e noventa e três reais e sessenta e três centavos), considerando os aditivos e apostilamentos de reajustes legais.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão, estão programadas em dotação orçamentária própria, à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício e seguintes, na dotação abaixo discriminada:

CÓDIGO PLANSET: ATM 07173 - Gerenciar a implantação do DTCEA-TWR

Funcional Programática: 05.151.6012.20XV.0002

Natureza da Despesa: 44.90.51

Índice de Meta: 17.033

Nota de Empenho: 2022NE002161

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. Consoante previsão contida no Projeto Básico, anexo ao Contrato, a CONTRATADA apresentará a complementação da garantia em decorrência do acréscimo do valor contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO ANEXA


5.1. Integra este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, o cronograma físico-financeiro em sua revisão 2.

6. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

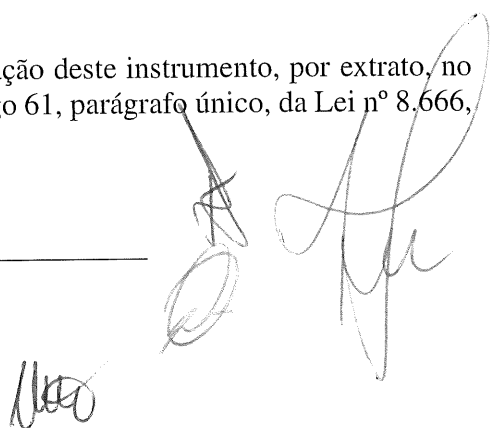

OSTENSIVO

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2022.

PELA CONTRATANTE:


Maj Brig Ar SERGIO BARROS DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas da CISCEA

MARCELO DA COSTA ANTUNES Col Ar
Ordenador de Despesas Substituto

PELA CONTRATADA:


HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
Diretor da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


AMANDA PRISCILA DE MOURA GABRIEL 1º Ten Int
Agente de Controle Interno


DAVID DE ZEVEDO DANTAS Cap Eng
Presidente da Comissão de Fiscalização

DNVBAHTRACYNACTRIBH107022
DNVBAHTRACYNACTRIBH107022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TA 02 ao CT 072/CISCEA/2020 - LOPEZ MARINHO
 Execução de obras de infraestrutura das novas instalações do DTCEA e Torre de Controle (TWR) - DTCEA-RF

Rev. 02

DIAS	DATA	ITEM	EVENTO	VALOR	TRA 01 e 02	TRA 03 Dez 20/21	VALOR TOTAL	%	VALOR ACUMULADO
					Dez 19/20				
					8,8086%	13,8480%			
0	24/06/2020		ORDEN DE SERVIÇO Nº 014/PR/2020						
30	24-jul-20	5.4.1	Medição Estimada	-	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
60	23-ago-20	5.4.2	Medição Estimada	-	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
98	30-set-20	5.4.3	1ª Medição - Período de 24/06/2020 até 30/09/2020	203.431,49	0,00	0,00	203.431,49	0%	203.431,49
129	31-out-20	5.4.4	2ª Medição - Período de 01/10/2020 à 31/10/2020	94.387,98	0,00	0,00	94.387,98	0%	297.819,47
159	30-nov-20	5.4.5	3ª Medição - Período de 01/11/2020 à 30/11/2020	131.695,32	0,00	0,00	131.695,32	1%	429.514,79
190	31-dez-20	5.4.6	4ª Medição - Período de 01/12/2020 à 31/12/2020	161.473,86	14.223,59	0,00	175.697,45	1%	605.212,24
221	31-jan-21	5.4.7	5ª Medição - Período de 01/01/2021 à 31/01/2021	81.895,42	7.213,84	0,00	89.109,26	1%	694.321,50
249	28-fev-21	5.4.8	6ª Medição - Período de 01/02/2021 à 28/02/2021	23.415,87	2.062,61	0,00	25.478,48	1%	719.799,98
280	31-mar-21	5.4.9	7ª Medição - Período de 01/03/2021 à 31/03/2021	110.891,75	9.768,01	0,00	120.659,76	1%	840.459,74
310	30-abr-21	5.4.10	8ª Medição - Período de 01/04/2021 à 30/04/2021	720.167,41	63.435,80	0,00	783.593,21	2%	1.624.052,95
341	31-mai-21	5.4.11	9ª Medição - Período de 01/05/2021 à 31/05/2021	374.373,69	32.977,08	0,00	407.350,77	3%	2.031.403,72
371	30-jun-21	5.4.12	10ª Medição - Período de 01/06/2021 à 30/06/2021	421.656,18	37.142,00	0,00	458.798,18	4%	2.490.201,90
402	31-jul-21	5.4.13	11ª Medição - Período de 01/07/2021 à 31/07/2021	529.487,97	46.640,48	0,00	576.128,45	4%	3.066.330,35
433	31-ago-21	5.4.14	12ª Medição - Período de 01/08/2021 à 31/08/2021	227.874,97	20.072,59	0,00	247.947,56	5%	3.314.277,91
463	30-set-21	5.4.15	13ª Medição - Período de 01/09/2021 à 30/09/2021	2.960.859,37	260.810,26	0,00	3.221.669,63	9%	6.535.947,54
494	31-out-21	5.4.16	14ª Medição - Período de 01/10/2021 à 31/10/2021	381.323,33	33.589,25	0,00	414.912,58	10%	6.950.860,12
524	30-nov-21	5.4.17	15ª Medição - Período de 01/11/2021 à 30/11/2021	446.121,62	39.297,07	0,00	485.418,69	11%	7.436.278,81
555	31-dez-21	5.4.18	16ª Medição - Período de 01/12/2021 à 31/12/2021	408.134,59	35.950,94	61.496,96	505.582,49	11%	7.941.861,30
586	31-jan-22	5.4.19	17ª Medição - Período de 01/01/2022 à 31/01/2022	1.393.206,83	122.722,01	209.925,83	1.725.854,67	14%	9.667.715,97
614	28-fev-22	5.4.20	18ª Medição - Período de 01/02/2022 à 28/02/2022	2.659.698,86	234.282,24	400.758,50	3.294.739,60	19%	12.962.455,57
645	31-mar-22	5.4.21	19ª Medição - Período de 01/03/2022 à 31/03/2022	2.175.823,58	191.659,60	327.849,07	2.695.332,25	23%	15.657.787,82
675	30-abr-22	5.4.22	20ª Medição - Período de 01/04/2022 à 30/04/2022	4.604.562,87	405.597,52	693.807,02	5.703.967,41	31%	21.361.755,23
706	31-mai-22	5.4.23	21ª Medição - Período de 01/05/2022 à 31/05/2022	1.122.341,94	98.862,61	169.112,41	1.390.316,96	33%	22.752.072,19
736	30-jun-22	5.4.24	22ª Medição Estimada	1.934.780,62	170.427,09	291.529,16	2.396.736,87	36%	25.148.809,06
767	31-jul-22	5.4.25	23ª Medição Estimada	2.428.648,83	213.929,96	365.944,31	3.008.523,10	40%	28.157.332,16
798	31-ago-22	5.4.26	24ª Medição Estimada	2.428.955,91	213.957,01	365.990,58	3.008.903,50	45%	31.166.235,66
828	30-set-22	5.4.27	25ª Medição Estimada	3.759.095,76	331.123,71	566.413,59	4.656.633,06	52%	35.822.868,72
859	31-out-22	5.4.28	26ª Medição Estimada	2.216.193,56	195.215,63	333.931,94	2.745.341,13	55%	38.568.209,85
889	30-nov-22	5.4.29	27ª Medição Estimada	2.561.994,45	225.675,84	386.036,58	3.173.706,87	60%	41.741.916,72
920	31-dez-22	5.4.30	28ª Medição Estimada	1.465.812,62	129.117,57	220.865,93	1.815.796,12	63%	43.557.712,84
951	31-jan-23	5.4.31	29ª Medição Estimada	1.326.335,08	116.831,55	199.849,71	1.643.016,34	65%	45.200.729,18
979	28-fev-23	5.4.32	30ª Medição Estimada	629.825,33	55.478,79	94.900,91	780.205,03	66%	45.980.934,21
1010	31-mar-23	5.4.33	31ª Medição Estimada	787.288,03	69.349,05	118.627,10	975.264,18	68%	46.956.198,39
1040	30-abr-23	5.4.34	32ª Medição Estimada	2.795.627,13	246.255,61	421.239,92	3.463.122,66	73%	50.419.321,05
1071	31-mai-23	5.4.35	33ª Medição Estimada	2.531.122,78	222.956,48	381.384,90	3.135.464,16	77%	53.554.785,21
1101	30-jun-23	5.4.36	34ª Medição Estimada	2.997.233,19	264.014,28	451.617,55	3.712.865,02	82%	57.267.650,23
1132	31-jul-23	5.4.37	35ª Medição Estimada	4.101.425,63	361.278,18	617.995,22	5.080.699,03	90%	62.348.349,26
1163	31-ago-23	5.4.38	36ª Medição Estimada	1.334.353,65	117.537,88	201.057,94	1.652.949,47	92%	64.001.298,73
1193	30-set-23	5.4.39	37ª Medição Estimada	1.531.963,11	134.944,50	230.833,37	1.897.740,98	95%	65.899.039,71
1224	31-out-23	5.4.40	38ª Medição Estimada	566.503,65	49.901,04	85.359,72	701.764,41	96%	66.600.804,12
1230	06-nov-23	5.4.41	39ª Medição Estimada	2.652.188,96	101.897,21	174.303,34	2.928.389,51	100%	69.529.193,63
			TOTAL	57.282.163,19	4.876.198,88	7.370.831,56	69.529.193,63		69.529.193,63

Prazo de Execução: 1230 dias corridos

Obs.: Cronograma elaborado conforme cronograma anexo à Carta da Lopez Marinho nº 129/2022, de 26/05/2022, e aprovado pelo PT nº 052.13.G00.PT.145.00, datado de 12/04/2022.

2020	605.212,24
2021	7.336.649,06
2022	35.615.851,54
2023	25.971.480,79
TOTAL	69.529.193,63
